



INFORME DE CIERRE

Plan de infraestructura y Gestión de recurso Hídrico al 2021 REGIÓN DEL MAULE

ÍNDICE

Página

1.- Presentación general	3
2.- Análisis Territorial de infraestructura: Formulación del Plan (2011)	4
3.- Síntesis de metas asociadas a Cartera de iniciativas del Plan	6
4.- Unidad territorial Homogénea	7
5.- Avance del Plan	8
6.- Cartografía de proyectos terminados y en ejecución, por Servicio	11
7.- Análisis Financiero	21
8.- Inversión ejecutada del Plan a nivel territorial	24
9.- Inversión ejecutada del Plan por habitante a nivel territorial	25
10.- Avance de los principales Indicadores Físicos	26
11.- Cumplimiento de Iniciativas:	
Planificado vs Ejecutado según porcentaje (Indicador Físico)	33
12.- Conclusiones	34
Anexos	36

1. Presentación general:

El Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico de la Región del Maule, se insertó en el desafío de planificar las intervenciones del Ministerio de Obras Públicas en el territorio que la Región requirió para el periodo 2012-2021 desde una mirada centralizada, principalmente se buscó, apoyar la transformación a una Región rural-moderna, con tradición y futuro, que apuesta a convertir a Chile en potencia agroalimentaria y forestal sobre la base del conocimiento, innovación y el emprendimiento, con una fuerte y una sostenida articulación público-privada, generando identidad regional asociada a su patrimonio histórico, natural, cultural y que apuesta al desarrollo del turismo de intereses especiales.

El principal objetivo de este Plan, fue generar un instrumento de planificación ministerial que permitió espacializar las líneas de acción definidas en el Plan Director del Ministerio 2010-2025, las políticas públicas nacionales, estrategias regionales y plan de gobierno y al mismo tiempo orientar y promover las actividades públicas y privadas en la región.

La propuesta presentada en su minuto fue elaborada de acuerdo a las metodologías desarrolladas por el Ministerio de Obras Públicas, principalmente la Guía para elaboración de planes MOP del año 2011. A partir de ella, se elaboró el Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico, el cual definió objetivos y metas para la Región del Maule al año 2021 las cuales no siempre estuvieron en sintonía con lo que requería la región año a año. Este plan fue construido a partir de un análisis del territorio, de la infraestructura en los ámbitos urbano y rural, y de la disponibilidad de los recursos hídricos en la Región; de esta manera se definen brechas que han sido la base para la identificación de la cartera de inversiones proyectada al 2021.

Las definiciones fueron elaboradas a partir de talleres, y posteriormente la realización de una consulta ciudadana; instancias que han validado la importancia del objetivo de transformar a la Región en una potencia agroalimentaria y forestal, y por tanto, desarrollar y dar continuidad a proyectos estratégicos relevantes para conseguir este objetivo, tales como: Construcción del Paso Internacional Pehuenche Ruta 115 – CH, el cual fue finalizado; Construcción del Puente Colbún sobre el Río Maule el cual también fue finalizado; Construcción Variante San Clemente en Ruta 115 – CH el cual fue ejecutado; Ampliación Reposición Ruta 115 - CH, sector Talca - San Clemente Habilitado; Habilitación Conexión Vial Ruta 115 - CH - Ruta 5 en Talca Aun en expropiaciones; Mejoramiento de la Ruta J-70-I Parronal – Lolol Muy buena ruta de conectividad con la región de O'Higgins; Mejoramiento Ruta M-50-N Cauquenes – Chanco parte de la Ruta Costera. ; Construcción Sistema de Regadío Embalse Ancoa, en plena marcha y Hospital regional de Curicó en proceso, como las iniciativas más relevantes de la región.

Con respecto a los proyectos no realizados de este plan, fueron principalmente, porque no contaron en su momento con el apoyo regional para ser ejecutados, problemas presupuestarios, asociados a la limitada cartera que tiene los ministerios, o simplemente no fueron prioridad para las autoridades regionales que estaban a cargo de la región en cada periodo de administración.

Los avances en la región fueron significativos, sobretudo en caminos básicos, APR y defensas fluviales, los cuales superaron totalmente las expectativas del plan. Cabe señalar que estos avances fueron por iniciativas regionales como convenios de programación con el Gobierno Regional, o iniciativas impulsadas por los servicios en la región.

2. Análisis Territorial de infraestructura: Formulación del Plan (2011).

2.1.1 Infraestructura Vial

La Región del Maule presenta un total 7.383 km de infraestructura vial, el cual se divide en un 45,2% de ripio, un 25,4% de tierra y un 17,6% de asfalto. En cuanto a Pasos Internacionales, la región posee dos pasos habilitados: Paso Vergara y Paso Pehuenche. Para la región representa el proyecto de inversión de mayor relevancia, inversión e impacto territorial. La construcción de este emblemático paso fronterizo responde a la necesidad de fortalecer los vínculos entre Chile y Argentina y el resto de los países del MERCOSUR. Sus 161 km, se iniciaron en 1994 con la pavimentación del tramo Talca-San Clemente y actualmente presenta obras de pavimentación en sus últimos 28 km. Lo que permitirá contar con el mismo operativo en toda su longitud el año 2012. De acuerdo a la vialidad estructurante, se avanzará en la culminación de las siguientes vías estructurantes:

- Construcción Acceso Sur Puente Llico (Camino Real)
- Construcción Puente Sobre Río Maule (Colbún) y Accesos
- Mejoramiento Ruta J-70-I, S. Cruce Ruta J-60 (Parronal)-Lim. Reg
- Construcción Variante San Clemente Ruta 115-Ch, Comuna de San Clemente
- Mejoramiento Ruta J-310/120, Cruce Ruta Longitudinal - La Aurora – Teno

2.1.2 Infraestructura Portuaria asociada a caletas pesqueras

Después de terremoto 27F, las caletas sufrieron bastante daño. Se considera la construcción del muelle Maguelines, como también la reparación y construcción de proyectos como Mejoramiento de los siguientes Bordes Costeros: Llico-Boyeruca-Lago Vichuquén, Duao-Iloca, Constitución y Curanipe-Pelluhue.

2.1.3 Infraestructura Aeroportuaria

Los aeródromos de uso público son General Freire, Municipal de Linares, El Bordo de Cauquenes y Panguilemo. Las características de estos cuatro aeródromos, es que tres de ellos cuentan con pista pavimentada en asfalto los cuales se deben mantener, y el cuarto está en proyecto su futura pavimentación (General Freire)

2.1.4 Infraestructura de Obras Hidráulicas

El programa de Defensas Fluviales apunta a la protección de los bordes fluviales afectados por crecidas frecuentes de modo que no sean alterados la infraestructura fiscal y los terrenos habitados o productivos. Se han realizado 6.001 m en 14 sectores. La infraestructura de riego en esta región está compuesta por los Embalses: El Planchón, Laguna del Maule, Digua, Bullileo y Tutuvén. En cuanto a canales, entre los principales están Maule Norte, Maule Sur, Melado, Pencahue, Melozal y Digua. La DOH ha construido colectores primarios en Linares: Colector Dren Yungay, en Villa Alegre: Colector Julio Tapia, en Curicó: Colector Trapiche. Este año, se iniciará la construcción del Colector Cuellar Urbanizado en la ciudad de Linares.

2.1.5 Agua Potable rural

El Programa de Agua Potable Rural de la Región del Maule promueve el desarrollo de las familias rurales, tanto en salud como en desarrollo social. La región cuenta con 265 sistemas de agua potable rural concentrados bajo tuición de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, los que se encuentran plenamente operativos a través de Comités o Cooperativas de APR. En cuanto, a localidades semiconcentradas que requieren del servicio de agua potable rural, a la fecha se han identificados un total de 28.

2.1.6 Edificación Pública y Patrimonial

En la Región existen múltiples edificaciones públicas que sufrieron daño por 27F cuya importancia está dada por la representatividad que cada una tiene; el principal edificio público es el edificio de la Intendencia Regional, sede del ejecutivo en la región y además el Edificio MOP y 2 sedes de Direcciones Regionales (DOH y DGA), éstas últimas localizadas fuera del edificio central, en Talca. La Dirección de Arquitectura apoyo a diversos servicios a objeto de levantar un catastro de los inmuebles dañados.

2.1.7 Infraestructura Hidrométrica

La Región del Maule cuenta en total con 101 estaciones hidrométricas. De las cuales 54 son meteorológicas y 55 son fluviométricas.

2.2 Análisis territorial de infraestructura basada en determinación de brechas y déficit

A partir del diagnóstico territorial y los instrumentos de base, así como la oferta de la infraestructura que le corresponde proveer al MOP, se ha establecido la necesidad de resolver brechas regionales en cinco ejes de desarrollo, reflejados en los territorios de planificación para la Región del Maule:

Desarrollo Competitivo y Logística Regional

- Mejorar la competitividad y logística regional
- Mejorar estándar de redes y ejes estructurantes que incrementen la competitividad
- Ampliar los servicios internacionales asociados al Paso Pehuenche

Fomento a Sectores Productivos

- Aumentar la seguridad de riego y uso eficiente del agua para mejorar el desarrollo agrícola y forestal
- Mejorar y mantener las caletas pesqueras
- Desarrollo Urbano y Territorial

Mejorar la calidad de vida en las ciudades y bordes costeros

- Reconstruir la edificación pública y patrimonial
- Reducir los riesgos de inundación y remoción en masa

Ruralidad

- Ampliar el acceso al APR y saneamiento rural básico
- Proveer mayor conectividad en caminos secundarios y mejoramiento de puentes menores

Recurso Hídrico

Promover la gestión y manejo integrado de las cuencas hidrográficas

3. Síntesis de metas asociadas a Cartera de iniciativas del Plan

Las metas están asociadas a inversiones que se financiarán tanto con fondos MOP, como extra MOP cuando forman parte de un Convenio de Programación vigente.

Sistemas de Agua Potable Rural Concentrado Ampliados Y Mejorados nº de sistemas 59 nº de arranques 10.641	Sistemas de Agua Potable Rural Semiconcentrado Nuevos nº de sistemas 40 nº de arranques 3.885	Pequeños aeródromos intervenidos 4
Edificación patrimonial Inmuebles patrimoniales intervenidos 32	Edificación pública Inmuebles Extra MOP (que albergan funciones públicas) intervenidos 57	Edificación pública Inmuebles Extra MOP (que albergan funciones públicas) nuevos 10
Inmuebles MOP intervenidos 11 Inmuebles MOP nuevos 2	Tramos protegidos defensas fluviales en zonas urbanas y/o rurales 14 sectores 6.646 m	Embalses nuevos 3 millones de m3 2,7
Colectores intervenidos 3 con 102.200 m Colectores nuevos 15 con 31.851 m	Sistemas de riego mejorados 1 con 36.000 hectáreas Sistemas de riego nuevos 6 con 273 hectáreas	Infraestructura del borde costero Paseos o bordes costeros nuevos 7 con 1.800 m
Infraestructura del borde costero Protecciones de ribera mejoradas 2 con 1.400 m	Infraestructura del borde costero Protecciones de ribera nuevas 3 con 2.155 m	Infraestructura pesquera artesanal Caletas pesqueras con obras marítimas construidas 3 Caletas pesqueras con obras terrestres construidas 1
Infraestructura pesquera artesanal Caletas pesqueras con obras terrestres nuevas 1	Puentes interurbanos repuestos 14 con 955 m	Caminos ampliados 15 km Caminos pavimentados nuevos 217 km
Obras de Vialidad urbana nuevos 1 con 3 Km	Estaciones fluviométricas intervenidas 2 Estaciones fluviométricas nuevas 1	Estaciones nivométricas nuevas 2 Estaciones para nivel de aguas subterráneas intervenidas 4

4. Unidad territorial Homogénea

La Estrategia Regional de Desarrollo de la Región del Maule contempla siete Territorios de Planificación coordinados desde el punto de vista técnico y operativo. Dichos territorios se encuentran insertos dentro de la actual división político-administrativa de la región. Los territorios de planificación se delimitaron en base a acciones destinadas a focalizar y/o coordinar las inversiones de origen estatal para la superación de problemas específicos de dichas áreas y se consideraron parámetros de tipo productivo (vocación y desarrollo productivo), geográfico (división político administrativo y conectividad vial) y social (características culturales y demográficas). Cabe señalar que en este proceso la ciudadanía no ha sido consultada, siendo los territorios entonces resultado de acuerdos entre el sector público y principalmente de los representantes locales (municipios).

Al trabajar dentro de los territorios propuestos permitiría realizar una planificación más efectiva a través de las UGITS, ya que existen direcciones provinciales de los servicios públicos y asociaciones de municipios, donde se pueden identificar de mejor manera los actores claves del territorio, la priorización de inversiones, los programas y los proyectos en cada uno de ellos. La definición de los territorios fue producto de un proceso combinado entre la aplicación de criterios técnicos, políticos, administrativos y estratégicos por parte de diferentes organismos del sector público, privado, gobiernos locales, sociedad civil, organizaciones comunitarias, entre otros.

Cabe señalar, que los procesos de territorialización seguirán produciéndose en la región y su delimitación no se puede considerar definitiva, sino que más bien en construcción. Los Territorios de Planificación (TP) contemplados en el Modelo de Gestión Territorial se observan en la Figura y son los siguientes:

- Territorio 1: Cuenca del Mataquito (Vichuquén, Hualañé, Licantén y Rauco).
- Territorio 2: Valle Central y Precordillera de Curicó (Curicó, Teno, Romeral, Sagrada Familia y Molina).
- Territorio 3: Área Poniente de la Provincia de Talca (Pencahue, Curepto, Constitución y Empedrado).
- Territorio 4: Valle Central y Precordillera de Talca (Talca, Río Claro, San Rafael, Pelarco, Maule y San Clemente).
- Territorio 5: Maule Sur (Cauquenes, Chanco y Pelluhue).
- Territorio 6: Área de Influencia Proyecto Embalse Ancoa (Linares, Villa Alegre, Yerbabuenas, Colbún y San Javier).
- Territorio 7: Asociación de Municipios (Longaví, Retiro y Parral).

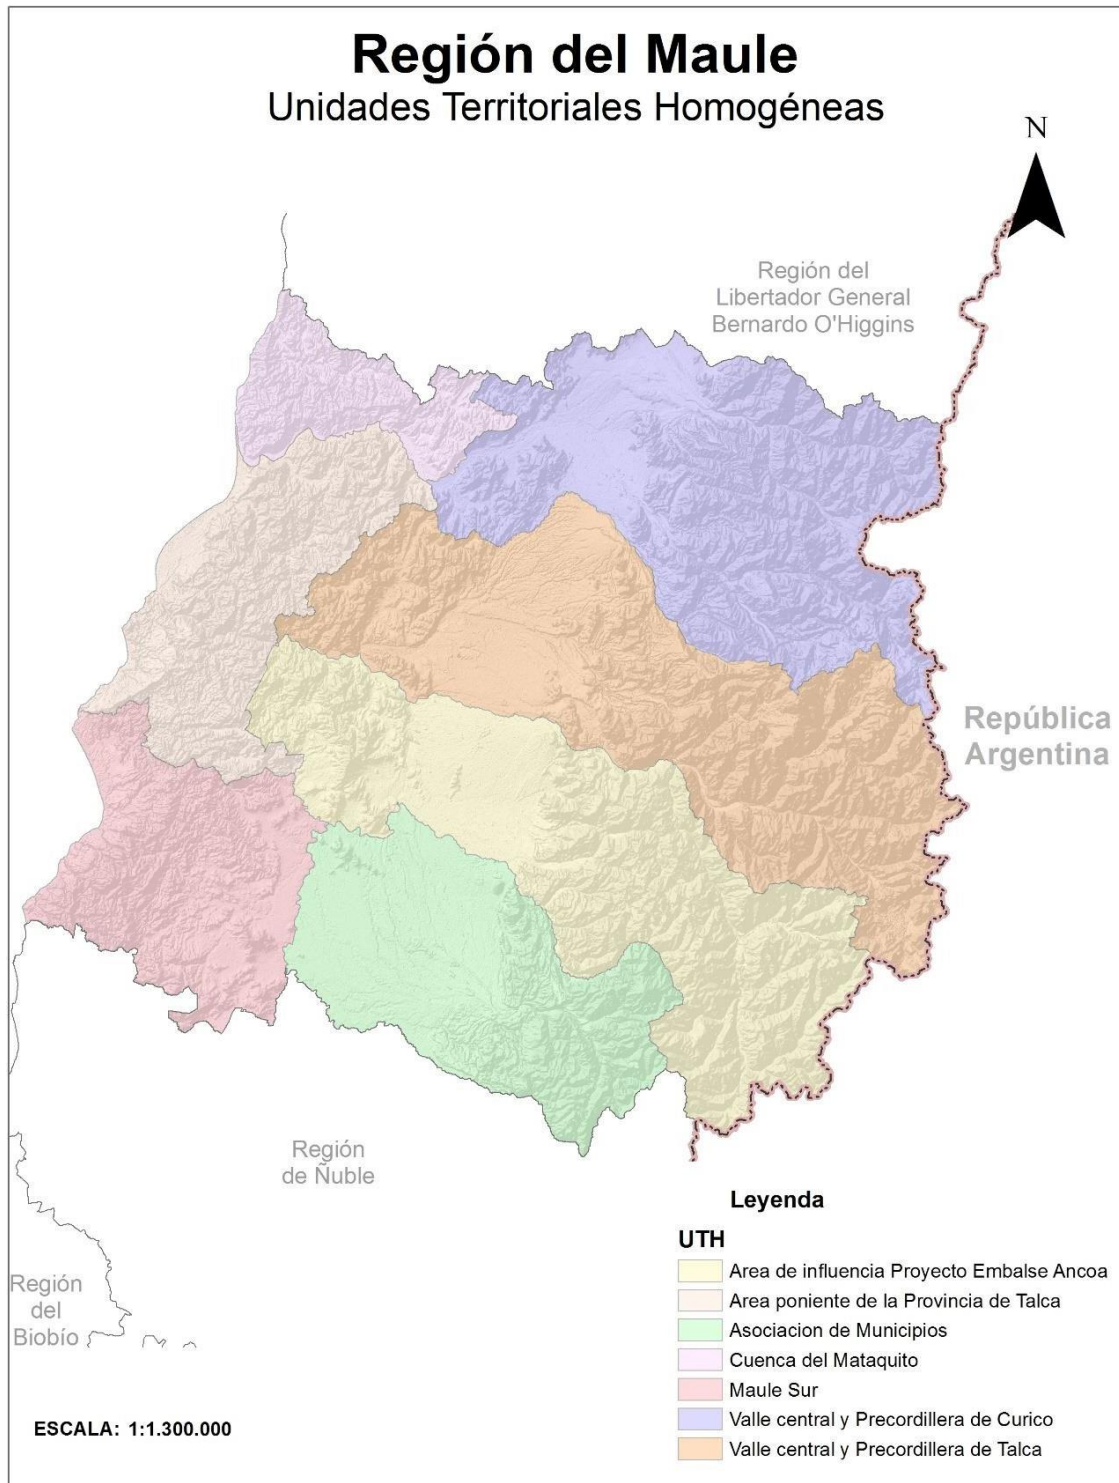


Figura 1: Territorios de Planificación

Número de iniciativas por UTH según estado

UTH	Iniciativas Programadas	Iniciativas Terminadas al año 2021	Iniciativas en ejecución	Iniciativas no iniciadas
Área de Influencia Proyecto Embalse Ancoa.	83	47	10	26
Área Poniente de la Provincia de Talca	36	16	6	14
Asociación de Municipios	40	21	3	16
Cuenca del Mataquito	27	9	6	12
Maule Sur	41	18	7	16
Región	47	23	4	20
Valle Central y Precordillera de Curicó	74	37	9	28
Valle Central y Precordillera de Talca	91	54	10	27
Valle Central y Precordillera de Talca ; Área Poniente de la Provincia de Talca	3	0	0	3
Valle Central y Precordillera de Talca; y Área de Influencia Proyecto Embalse Ancoa.	1	0	0	1
Total general	443	225	55	163

5. Avance del Plan

6.1. Avance por Eje Estratégico

Eje Estratégico	Número Total de Iniciativas Programadas	Iniciativas Terminadas al año 2021	Iniciativas en ejecución al 2021	% de Avance
Calidad de Vida	280	157	28	66,1%
Conectividad Regional	84	41	23	76,2%
Desarrollo Económico Productivo	51	19	3	43,1%
Uso Eficiente del Agua	28	8	1	32,1%
Total general	443	225	55	63,2%

5.2. Avance por Servicio MOP y Financiamiento

Servicio	Número Total de Iniciativas Programadas	Iniciativas Terminadas al año 2021	Iniciativas en ejecución al 2021	% de Avance
Administración Sistema Concesiones	3	3	0	100,0%
Agua Potable Rural	116	69	6	64,7%
Dirección de Aeropuertos	5	2	0	40,0%
Dirección de Arquitectura	119	68	17	71,4%
Dirección de Obras Hidráulicas	49	10	2	24,5%
Dirección de Obras Portuarias	22	14	3	77,3%
Dirección de Vialidad	101	51	26	76,2%
Dirección General de Aguas	28	8	1	32,1%
Total general	443	225	55	63,2%

6. Cartografía de proyectos terminados y en ejecución, por Servicio

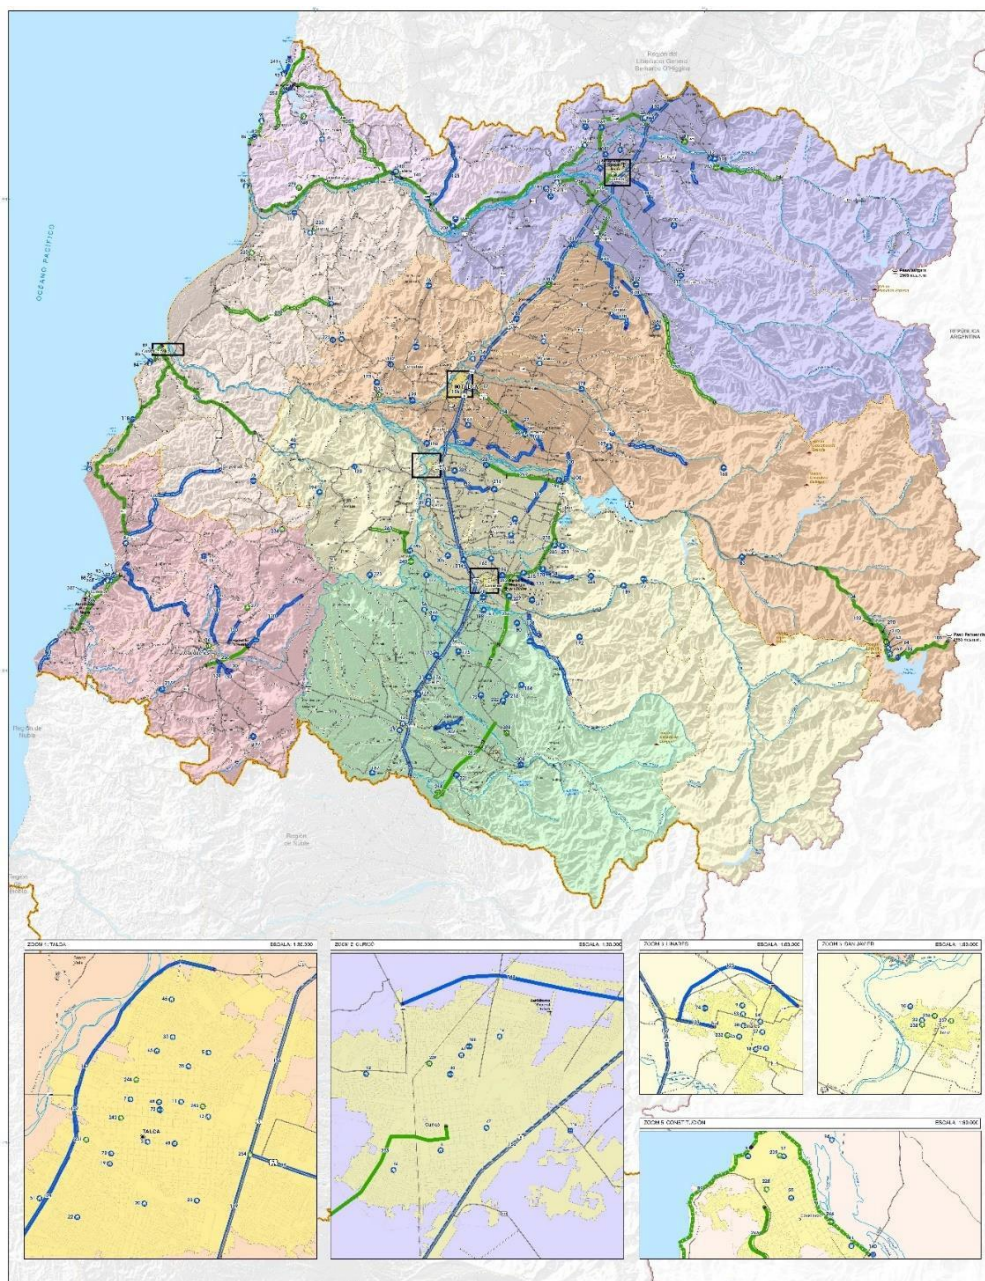


Figura 2: Cartografía de proyectos (formato QR)

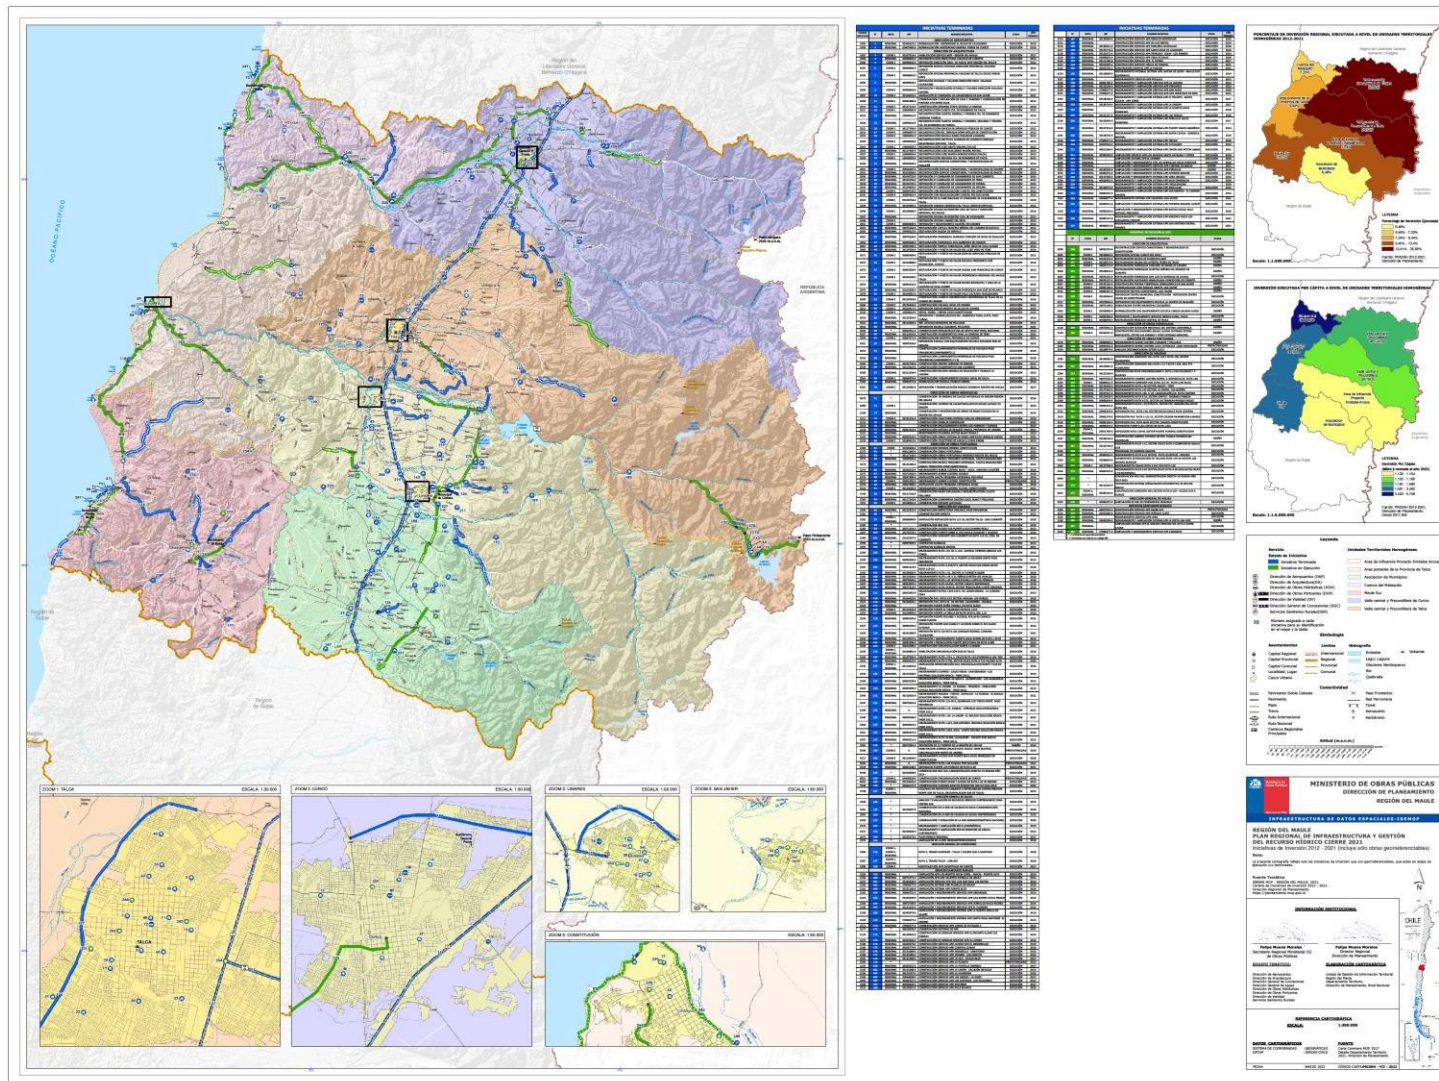


Figura 2: Cartografía de proyectos terminados y en ejecución, por Servicio

6.2.1. Principales proyectos terminados por Servicio

Ampliación y Mejoramiento Servicio APR Potrero Grande

Mej. Serv. APR potrero Grande – Correlativo 7253

Iniciativa: Ampliación y Mejoramiento Servicio APR Potrero Grande

Eje Estratégico: Calidad de Vida

Acción Estratégica: Aumentar cobertura de APR

Código BIP: 30483315-0

Financiamiento: Sectorial

Fecha de Inicio: 10-09-2018

Fecha de término: 25-09-2019

Monto M\$: 1.278.414

Localización: Comuna de Curicó, Provincia de Curicó



Descripción: En este APR se realizaron Obras de captación: reemplazo de drenes en estero potrero grande, reemplazo de tuberías, piezas especiales y nuevo equipo de bombeo. - Instalación de 140 arranques domiciliarios nuevos. -Reconexión de 100 arranques domiciliarios. - Instalación de obras eléctricas para los equipos, incluye grupo electrógeno. -Beneficiarios: 373 viviendas,

Mejoramiento y Ampliación servicio APR Santa Rosa de Lavadero.

Ser. APR Santa Rosa de Lavadero – Correlativo 2217

Iniciativa: Construcción Servicio APR
Santa Rosa de Lavadero

Eje Estratégico: Calidad de Vida

Acción Estratégica: Aumentar
cobertura de APR

Código 81P: 30135774-0

Financiamiento: Sectorial

Fecha de Inicio: 7/11/2017 (Obra)

Fecha de término: 2/12/2018

Monto MS: 686.233

Localización: Comuna de Maule,
Provincia de Talca



Descripción: se habilita sondaje existente (50 m profundidad, se encamisa completo), el cual posee un caudal de 301/s, que es más que suficiente para abastecer la demanda estimada de 6,4l/s entre el año 10 al 20. - La habilitación del sondaje incluye además la inclusión de un equipo de bombeo, equipo de dosificación hipoclorito para sanitizar el agua. - El equipo de bombeo requerido debe ser capaz de suministrar, al año 10 y 20, un caudal de 6,4l/s a una altura de 9,45 m

Restauración Parroquia San Ambrosio de Chaneo.

Restauración Parroquia – Correlativo 2062

Iniciativa: Restauración Parroquia San Ambrosio de Chanco

Eje Estratégico: Calidad de Vida

Acción Estratégica: Valorar el Patrimonio

Código BIP: 30095640-0

Financiamiento: Extrasectorial

Fecha de Inicio: 18-05-2016 (Obra)

Fecha de término: 09-11-2017

Monto M\$: 1.407.415 (FNDR)

Localización: Comuna de Chaneo, Provincia de Cauquenes



Descripción: Este proyecto arquitectónico patrimonial contempló la reconstrucción de la casa parroquial, casa de ejercicios y la iglesia. Los principales trabajos se concentraron en la consolidación de la casa principal, con la liberación de encalados, corredores y la techumbre, sistemas constructivos de la cubierta de madera, de cimientos, sobre cimientos, muros de adobe y quincha, salón multiuso, velatorio, comedor y cocina, retablo, piezas de madera, mobiliario, pintura mural e imagerie religiosa.

Reposición Puente Los Puercos en Ruta K-60, Km 17,34.

Reposición Puente los Puercos – Correlativo 5528

Iniciativa: Reposición Puente Los Puercos en Ruta K-60, Km 17,34.

Eje Estratégico: Puentes Urbanos
Repuestos

Acción Estratégica: Conectividad Vial

Código 81P:40004148-0

Financiamiento: Sectorial

Fecha de Inicio: 20-02-2020

(Obra) **Fecha de término:** 19-06-

2021 **Monto** M\$:3.268.744(MOP)

Localización: Comuna de Pencahue,
Provincia de Talca.



Descripción: La reposición del puente Los Puercos, ubicado en la Ruta K-60, sector del km. 17,34; en una longitud total aproximada de 90 m. viene a reemplazar la actual estructura que se encuentra en mal estado y con alto grado de deterioro. El proyecto contempla tres tramos de 30 m. cada uno y dos cepas centrales, ambos con fundaciones basados en pilotes pre-excavados in situ. Esta estructura es la única que permite dar continuidad de tránsito en el sector, y en cualquier momento podría verse inhabilitado el paso de vehículos, y es por ello que se debe contar con una obra que otorgue seguridad de continuidad a la vía, lo cual justifica en gran medida su reposición.

Mejoramiento Ruta115 CH,Puente Lo Aguirre- Limite Paso Pehuenche.-

Mejoramiento Ruta 115 CH – Correlativo 2295

Iniciativa: Mejoramiento Ruta 115 CH,
Puente Lo Aguirre- Limite Paso Pehuenche.

EjeEstratégico: Red Vial

Acción **Estratégica:** Conectividad
Internacional

Código81P:30083200-0

Financiamiento: Mixto

Fecha de Inicio: 20-11-2009(Obra)

Fecha de término: 08-10-2013

Monto MS:44.857.901 (Mixto)

Localización: Comuna de San Clemente,
Provincia de Talca



Descripción: Corresponde a la pavimentación de la Ruta 115-CH desde el Km. 133.1(sector Puente Lo Aguirre) al Km. 160,3 (Límite con la República de Argentina). La longitud total del proyecto es de 28.4 Km. Corresponde al último tramo de la Ruta en Dirección Oriente que conectará con la República Argentina en el Paso Internacional Pehuenche. La geometría del camino maximiza el uso de la plataforma actual, velocidades de proyecto de 70 Km/hr., con restricciones a 50 Km/hr. Dentro de sus principales obras se contempla la pavimentación, de 7 m de ancho, en concreto asfáltico de Rodadura, bermas de 1.50 m. y un sobre ancho de protección de 0.50 m.

Normalización Hospital de Curicó

Normalización Hospital de Curicó – Correlativo 5550

Iniciativa: Normalización Hospital de Curicó

Eje Estratégico: Calidad de Vida.

Acción Estratégica: Mejoramiento Edificación Pública.

Código BIP: 30067571-0

Financiamiento: Extrasectorial

Fecha de Inicio: 10-09-2016 (Obra)

Fecha de término: 20-08-2021

Monto: M\$ 215.394.041 (MINSAL)

Localización: Comuna de Curicó, Provincia de Curicó



Descripción: Región del Maule fue una de las más afectadas con la pérdida de infraestructura sanitaria tras el terremoto del 2010. Es por esto que, en Septiembre del 2016, se dio inicio a las obras de lo que será el centro de salud más grande de la Región del Maule. El diseño estructural del proyecto que será **sísmicamente aislado** y contará con 110 mil m² de construcción dividida en 7 niveles.

Mejoramiento Borde Costero Duao-1loca.

Borde Costero Duao - Iloca - Correlativo 2274

Iniciativa: Mejoramiento Borde Costero Duao - Iloca

Eje Estratégico: Calidad de Vida.

Acción Estratégica: Mejoramiento infraestructura publica

CódigoBIP: 30036325-0

Financiamiento: Sectorial

Fecha de Inicio:01-01-2013 (Obra)

Fecha de término:06-07-2018

Monto M\$:2.281.363(MOP)

Localización: Comuna de Licanten, Provincia de Curicó



Descripción: Contempla la construcción de un muro de defensa de hormigón en un tramo que va desde la caleta pesquera artesanal hasta la plaza de Armas de la localidad de Duao, pasando por un sector de la Ruta Costera, consolidando un tramo de aproximadamente 400ml. El muro será conformado por losetas de hormigón prefabricadas soportadas por pilotes HN o por una configuración gravitacional de hormigón en masa.

Normalización Aeródromo el Boldo de Cauquenes.

Normalización Ae. El Boldo – Correlativo 1992

Iniciativa: Normalización el Boldo De Cauquenes

Eje Estratégico: Pequeños Aeródromos

Acción Estratégica: Mejoramiento Infraestructura publica

CódigoBIP: 30365222-0

Financiamiento: Extrasectorial

Fecha de Inicio:06-01-2016 (Obra)

Fecha de término:03-08-2016

Monto M\$:658.890(FNDR)

Localización: Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes.



Descripción: El aeródromo está ubicado en comuna de cauquenes, pertenece a la red de pequeños aeródromos, el principal rol es atender operaciones aéreas asociadas a emergencias y extinción de incendios y está considerado dentro de la en zona de rezago. Se hace necesario realizar una conservación rutinaria en las áreas de movimiento del aeródromo, que permita garantizar el funcionamiento óptimo y que cumpla con las condiciones de seguridad aérea que este tipo de Infraestructura debe entregar.

7. Análisis Financiero

7.1. Seguimiento Financiero del Plan (en millones de pesos 2022)


Tipo de Financiamiento	Total de la Inversión Planificada en el Plan 2012-2021	Inversión Ejecutada 2012-2021	Avance respecto de lo planificado (%)
MOP	1.521.651	1.037.194	68,2%
Extra MOP	638.208	555.850	87,1%
Privado	27.585	48.192	174,7%
Total	2.187.444	1.641.236	75,0%

7.2. Avance Anual de Financiamiento Sectorial (en millones de pesos 2022)

Año	Planificado	Ejecutado	Avance (%)	Ejecutado MOP	% Ejecutado Plan vs MOP
2012	124.809	114.134	91,4%	127.975	89,2%
2013	140.471	116.154	82,7%	115.428	100,6%
2014	130.006	110.485	85,0%	112.169	98,5%
2015	143.508	106.584	74,3%	107.391	99,2%
2016	210.758	93.991	44,6%	91.433	102,8%
2017	233.868	110.849	47,4%	119.124	93,1%
2018	197.130	94.645	48,0%	103.191	91,7%
2019	161.683	100.379	62,1%	100.874	99,5%
2020	88.521	97.023	109,6%	109.790	88,4%
2021	90.898	92.950	102,3%	94.683	98,2%
Total	1.521.651	1.037.194	68,2%	1.082.058	95,9%


7.3. Avance del Financiamiento Sectorial por Servicio (en millones de pesos 2022)

Total de la Inversión programada en el Plan 2012-2021		Inversión Total Ejecutada Acumulada 2012-2021	Avance (%)
APR	45.771	46.997	102,7
DAP	430	536	124,7
DA	15.098	7.536	49,9
DV	955.952	828.959	86,7
DOP	52.695	40.193	76,3
DGA	3.143	499	15,9
DOH	311.601	97.045	31,1
CC	136.962	15.431	11,3
Total general	1.521.652	1.037.194	68,2

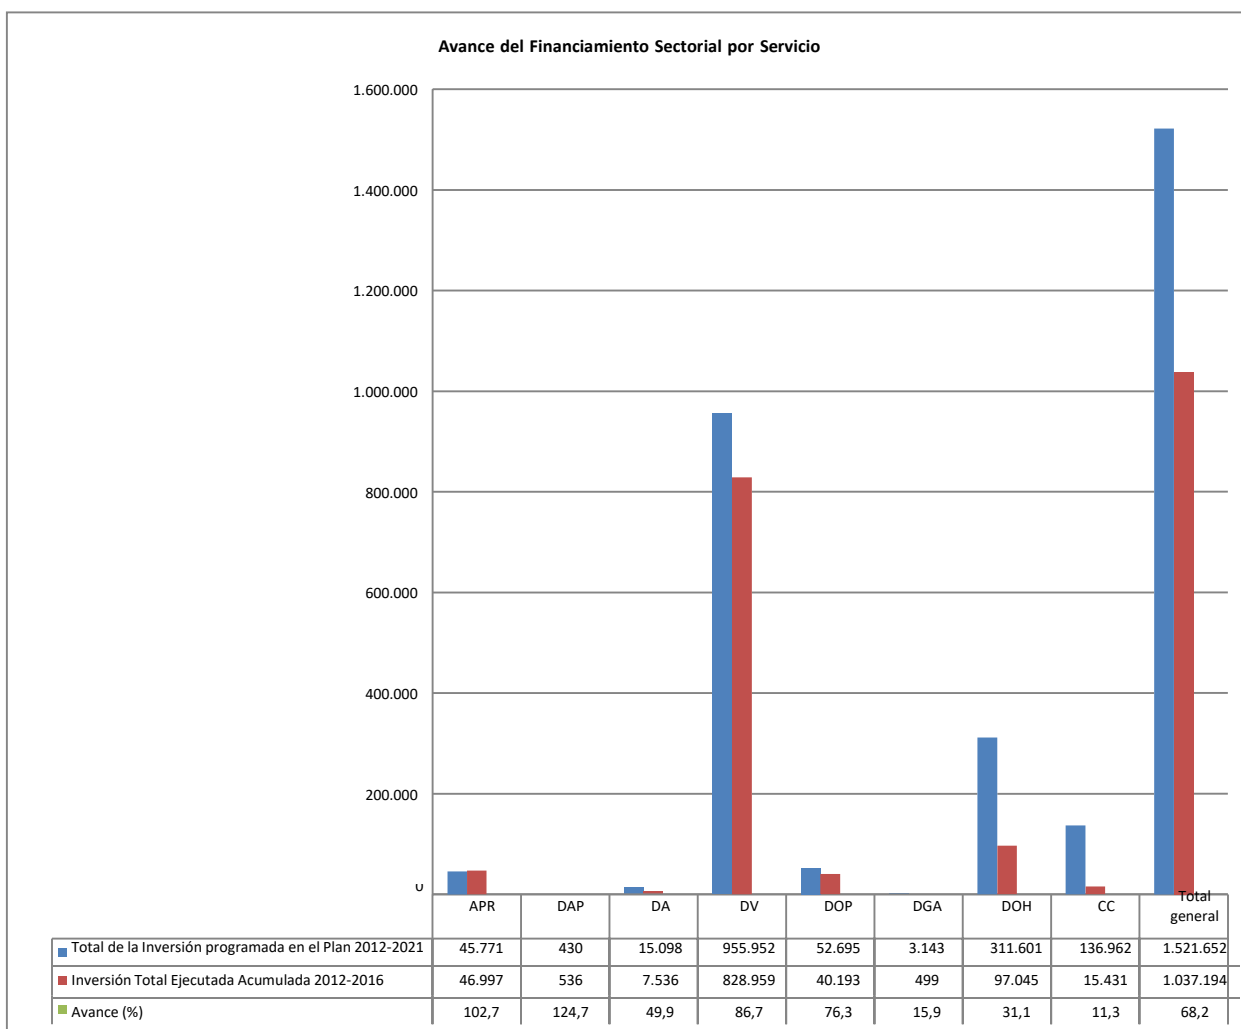


7.4. Avance del Financiamiento Extrasectorial por Servicio (en millones de pesos 2022)

Servicio	Total de la Inversión programada en el Plan 2012-2021	Inversión Total Ejecutada Acumulada 2012-2021	Avance(%)
APR	8.537	892	10,4
DAP	4.125	46	1,1
DA	491.784	476.255	96,8
DV	107.958	74.837	69,3
DOP	15.552	3.162	20,3
DGA	1.476	0	0,0
DOH	8.776	659	7,5
Total general	638.208	555.850	87,1

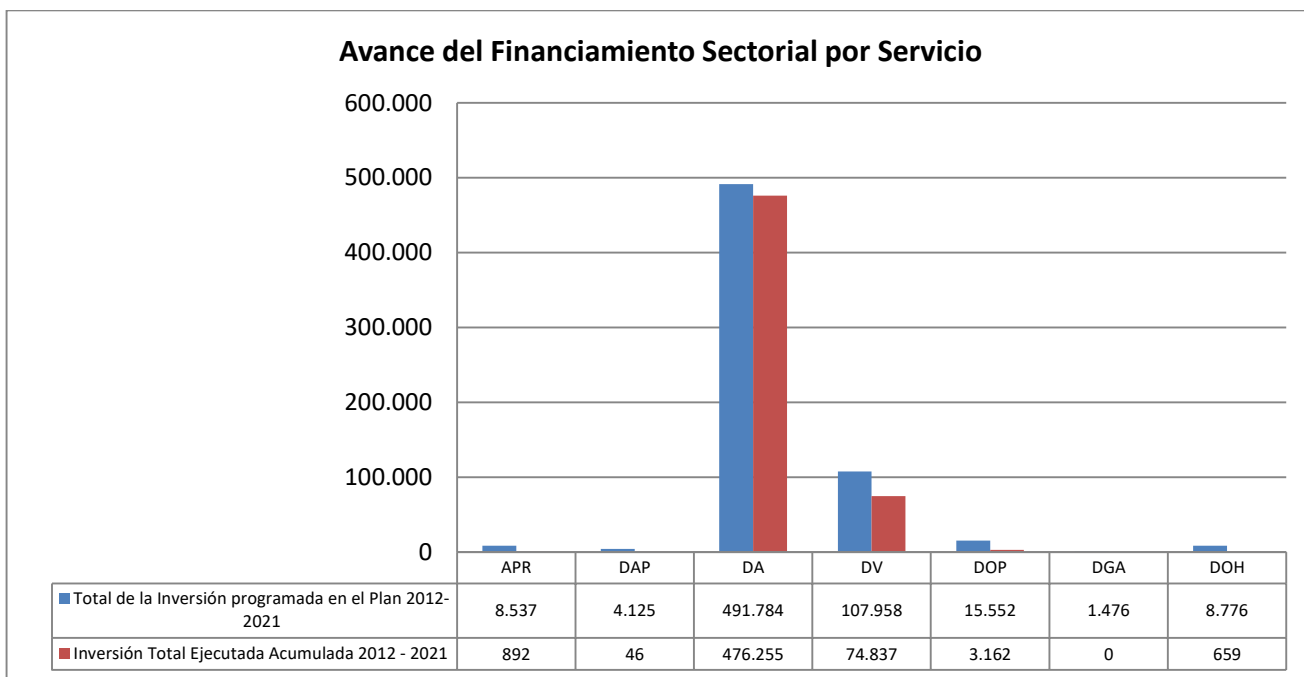


8. Inversión ejecutada del Plan a nivel territorial.

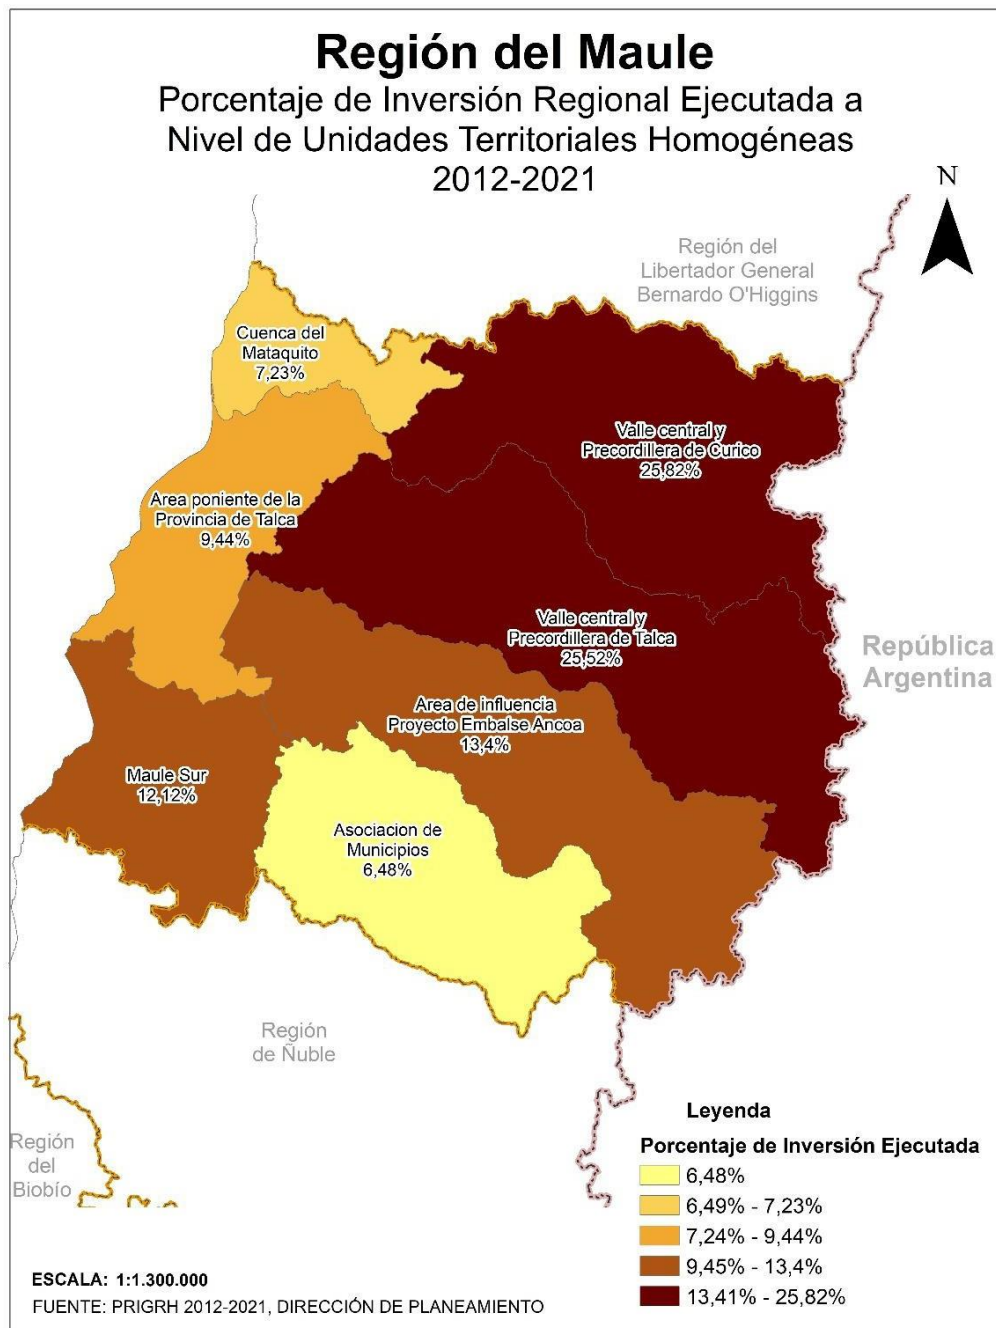

La cartografía muestra que las UTH Valle central y precordillera de Curicó y Talca, generan un porcentaje de ejecución de 51,34 %. Esto es debido a que individualmente concentran los proyectos de gran inversión como el Hospital de Curicó, Recinto modelo La Laguna, Puente sobre el Río Maule, Paso Pehuenche entre otros proyectos de gran envergadura. Las demás unidades territoriales, concentran un porcentaje similar, pero comparando con los porcentajes más altos con los más bajos (Cuenca del Mataquito y Asociación de municipios), se presenta una diferencia de dos dígitos.

9. Inversión ejecutada del Plan por habitante a nivel territorial.

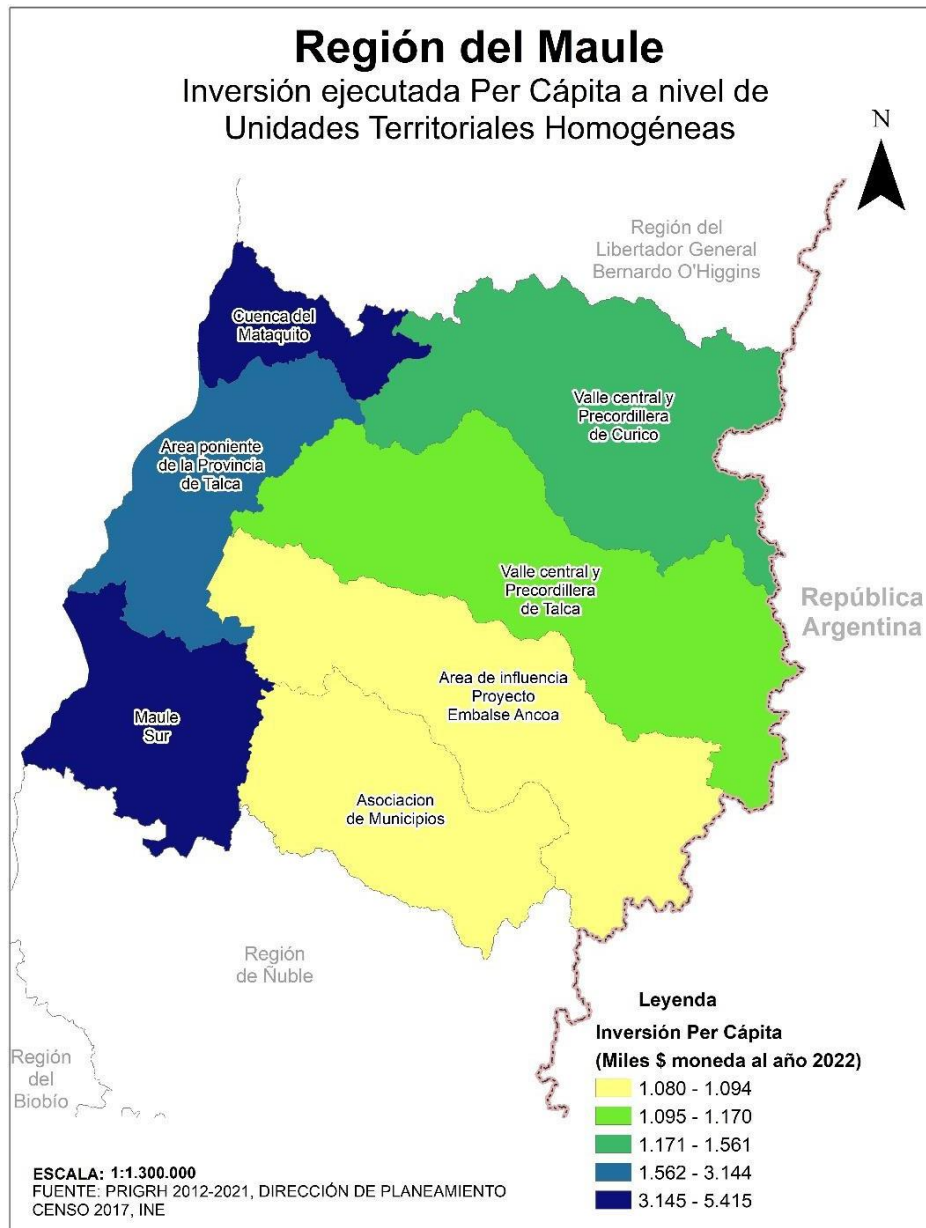

Las UTH costeras de la región del Maule, las cuales son la Cuenca del Mataquito, Área poniente de la Provincia de Talca y Maule, presentan un alto y muy alta inversión per cápita, dado que concentra un 13% de la población, pero la inversión es el doble con un 28,79%, considerando que son áreas de rezago. Esto está representado exclusivamente por las obras de alta inversión como Reposición Pav. Ruta M-50 Sector: Chanco-Constitución y Cauquenes – Chanco, embalse Empedrado y Mejoramiento Ruta M-80-N, Sector Tregualemu-Límite Regional entre las más destacadas. Los demás UTH muestran una inversión per cápita homogénea entre área de influencia del proyecto Ancoa y asociación de municipios y una diferencia baja entre los Valles de Talca y Curicó.

10. Avance de los principales Indicadores Físicos

10.1. Servicio Sanitarios Rurales

N° de Sistemas concentrados ampliados y mejorados



48

N° de Sistemas Semiconcentrados nuevos



27

Arranque de Sistemas concentrados ampliados y mejorados



3.846

Arranque de Sistemas Concentrados ampliados y mejorados



10.385

10.2. Dirección de Aeropuertos

N° de Pequeños aeródromos intervenidos



4

10.3. Dirección de Arquitectura

N° de Inmuebles patrimoniales intervenidos



14

N° de Inmuebles Extra MOP (que albergan funciones públicas) intervenidos



39

N° de Inmuebles Extra MOP (que albergan funciones públicas) nuevos



8

N° de Inmuebles MOP intervenidos



8

N° de Inmuebles MOP nuevos



4

10.4. Dirección de Vialidad



10.5. Dirección de Obras Portuarias

N° de Paseos o bordes costeros nuevos



4

Mts de protecciones de ribera mejoradas



1.100

Mts de protecciones de ribera nuevas



3.915

N° de Caletas pesqueras con obras marítimas construidas



3

N° de Caletas pesqueras con obras terrestres construidas



1

N° de Caletas pesqueras existentes mejoradas por el plan regional de infraestructura



2


10.6. Dirección General de Aguas

N° de Estaciones fluviométricas intervenidas




10

N° de Estaciones fluviométricas nuevas

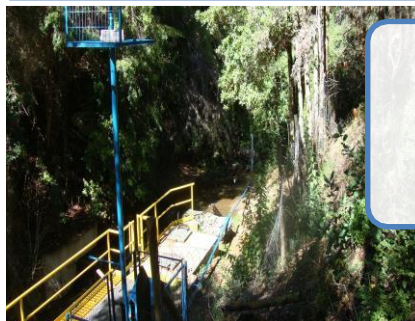

10

N° de Estaciones nivométricas (o rutas de nieve) nuevas

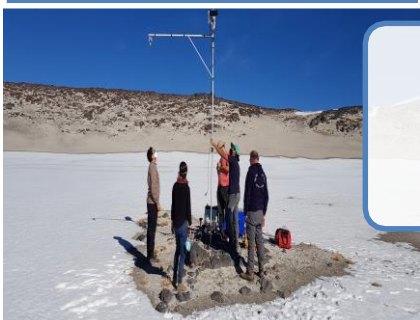

2

N° de Estaciones para nivel de aguas subterráneas intervenidas



7

10.7. Dirección de Obras Hidráulicas

Mts de Tramos protegidos con obras para el manejo de cauces en zonas urbanas y/o rurales



168.601

N° de Embalses construidos



1

Mts de Colectores Intervenidos



76.720

Mts de Colectores nuevos



8.217

N° de Sistema de Riego mejorados



1

N° de Sistema de Riego Nuevos



1

10.8. Dirección General de Concesiones

N° de Hospitales concesionados



1

Kms de Infraestructura vial concesionada



72

11. Cumplimiento de Iniciativas: Planificado vs Ejecutado según porcentaje (Indicador Físico)

Sistemas de Agua Potable Rural Concentrado Ampliados Y Mejorados nº de sistemas 81% nº de arranques 98%	Sistemas de Agua Potable Rural Semiconcentrado Nuevos nº de sistemas 68% nº de arranques 99%	Pequeños aeródromos intervenidos 100%
Edificación patrimonial Inmuebles patrimoniales intervenidos 44%	Edificación pública Inmuebles Extra MOP (que albergan funciones públicas) intervenidos 68%	Edificación pública Inmuebles Extra MOP (que albergan funciones públicas) nuevos 80%
Inmuebles MOP intervenidos 73% Inmuebles MOP nuevos 200%	Tramos protegidos defensas fluviales en zonas urbanas y/o rurales 2537%	Embalses construidos 33% millones de m3 100%
Coletores intervenidos 75% Coletores nuevos 26%	Sistemas de riego mejorados 100% Sistemas de riego nuevos 17%	Infraestructura del borde costero Paseos o bordes costeros nuevos 57%
Infraestructura del borde costero Protecciones de ribera mejoradas 79%	Infraestructura del borde costero Protecciones de ribera nuevas 133%	Infraestructura pesquera artesanal Caletas pesqueras con obras marítimas construidas 100% Caletas pesqueras con obras terrestres construidas 100%
Infraestructura pesquera artesanal Caletas pesqueras con obras terrestres nuevas 50%	Puentes interurbanos repuestos 100%	Caminos ampliados 100% Caminos pavimentados nuevos 100%
Obras de Vialidad urbana nuevos 100%	Estaciones fluviométricas intervenidas 500% Estaciones fluviométricas nuevas 1000%	Estaciones nivométricas nuevas 100% Estaciones para nivel de aguas subterráneas intervenidas 175%

12. Conclusiones:

El resultado final del Plan entre el periodo 2012-2021, entre iniciativas programadas y terminadas-en ejecución es de 63,2%. Con respecto a la inversión programada y la inversión ejecutada, el financiamiento sectorial presenta un avance de 68,2% y el extrasectorial presenta un avance de 87,1%. Tal como se ha expuesto en los párrafos anteriores, si se miran los números a gran escala, el plan desde el punto de vista regional fue medianamente exitoso, considerando situaciones generales que afectan las metas como por ejemplo modificaciones en la programación financiera, priorización de otros proyectos de interés regional, retraso por procesos de expropiaciones y retraso en diseños por temas de prioridad y financieros, problemas de presupuesto que dependan de financiamientos Extra MOP entre los más significativos.

12.1. Análisis de los logros y resultados

El mayor beneficio de este plan, fue que dio inicio a muchas obras y convenios que fueron exitosos para la región. Por ejemplo muchos kilómetros de caminos básicos, sistemas APR que entregaron una gran cantidad de arranques a la comunidad regional, un catastro importante de edificios patrimoniales por intervenir entre otros. Por otra parte, la región del Maule se caracteriza por ser netamente agrícola, por lo tanto la conectividad de infraestructura vial es esencial para el traslado de los productos a los puntos de venta. En este contexto, Vialidad avanzó con una cantidad importante de proyectos en caminos básicos y caminos estructurantes que han ayudado bastante a superar esta brecha.

Los avances en la región fueron significativos, sobretodo en caminos básicos, APR y defensas fluviales, los cuales superaron totalmente las expectativas del plan, debido a contingencias tanto físicas como presupuestarias. Cabe señalar que estos avances fueron por iniciativas regionales como convenios de programación con el Gobierno Regional, o iniciativas impulsadas por los servicios en la región.

12.2. Análisis de lo que no se hizo

Con respecto a los proyectos no realizados de este plan, fueron principalmente, porque no contaron en su momento con el apoyo regional para ser ejecutados, problemas presupuestarios, asociados a la limitada cartera que tiene los ministerios, o simplemente no fueron prioridad para las autoridades regionales que estaban a cargo de la región en cada periodo de administración.

La sequía ha sido otro factor importante en la región el último tiempo, los proyectos DOH van orientados hacia ese punto y con la mirada actual, por lo tanto estos planes de largo plazo han debido cambiar por la contingencia.

Los proyectos patrimoniales de Arquitectura han tenido poco avance debido a la priorización por parte de las autoridades, para las personas es mucho más importante un APR o un camino, que edificios consistoriales, (los cuales han sido solicitados por prácticamente todas las municipalidades de la Región).

12.3. Experiencias aprendidas y recomendaciones para futuros planes.

Es importante que estos planes tengan más opinión regional y estén abiertos a realizar modificaciones, quizás más que definir proyectos, definir montos para algún tipo de proyectos.

Si bien se realizaron participaciones ciudadanas, quizás no fueron suficientes, además que las distintas comunas de la región tienen realidades en ocasiones muy distintas. Una comuna costera de Maule norte, no tiene la misma realidad que una comuna costera de Maule sur.

Más que realizar un gran plan nacional, se deben priorizar realizar planes regionales, donde esta sea quien realiza los seguimientos y realice las conversaciones con los diversos actores para la realización y selección de los proyectos más importantes, para una gestión territorial y ambiental equilibrada.

12.4. Análisis Territorial de infraestructura: Formulación del Plan (2021).

Infraestructura Vial

La Región del Maule aumento 217 km más a su red vial de asfalto (caminos básicos y red vial primaria). En cuanto a Pasos Internacionales, la región termino el paso Internacional Pehuenche en ruta 115 CH, lo que lo convierte en una alternativa estructurante al paso Internacional los Libertadores. De acuerdo a la vialidad estructurante, terminaron las siguientes vías estructurantes:

- Construcción Acceso Sur Puente Llico (Camino Real)
- Construcción Puente Sobre Rio Maule (Colbún) y Accesos
- Mejoramiento Ruta J-70-I, S. Cruce Ruta J-60 (Parronal)-Lim. Reg
- Construcción Variante San Clemente Ruta 115-Ch, Comuna de San Clemente

Infraestructura Portuaria asociada a caletas pesqueras

Se terminó la construcción del muelle Maguelines, como también la reparación y construcción de proyectos como Mejoramiento de los siguientes Bordes Costeros: Llico-Boyeruca-Lago Vichuquén, Duao-Iloca, Constitución y Curanipe-Pelluhue.

Infraestructura Aeroportuaria

Los aeródromos de uso público son General Freire, Municipal de Linares, El Boldo de Cauquenes y Panguilemo. Las características de estos cuatro aeródromos, es que tres de ellos cuentan con pista pavimentada en asfalto

Infraestructura de Obras Hidráulicas

El programa de Defensas Fluviales apunta a la protección de los bordes fluviales afectados por crecidas frecuentes de modo que no sean alterados la infraestructura fiscal y los terrenos habitados o productivos. Se han realizado 168 Km en 16 sectores. La DOH ha terminado la construcción del Colector Cuellar Urbanizado en la ciudad de Linares.

Servicios Sanitarios rurales El Programa de Agua Potable Rural de la Región del Maule promueve el desarrollo de las familias rurales, tanto en salud como en desarrollo social. SE aumento en 27 nuevos sistemas semiconcentrados y se ampliaron y mejoraron 48 sistemas.

ANEXO N°1

Total de Indicadores físicos por Servicio y tipología

Servicios Sanitarios Rurales

Tipología de Obras	Indicador Físico	Unidad de Medida	Meta al 2021	Avance a Diciembre 2021	
				Valor	%
Servicios Sanitarios Rurales	Sistemas de Agua Potable Rural Concentrado Ampliados Y Mejorados	nº de sistemas	59	48	81%
		nº de arranques	10.641	10.385	98%
	Sistemas de Agua Potable Rural Semiconcentrado Nuevos	nº de sistemas	40	27	68%
		nº de arranques	3.885	3.846	99%
Promedio del avance de las metas a diciembre del 2021					87%

Dirección de Aeropuertos

Tipología de Obras	Indicador Físico	Unidad de Medida	Meta al 2021	Avance a diciembre 2020	
				Valor Meta	% de la Meta
Pequeños Aeródromos	Pequeños aeródromos intervenidos	nº	4	4	100
Promedio del avance de las metas a diciembre del 2021					100

Dirección de Arquitectura

Tipología de Obras	Indicador Físico	Unidad de Medida	Meta al 2021	Avance a diciembre 2020	
				Valor Meta	% de la Meta
Edificación patrimonial	Inmuebles patrimoniales intervenidos	nº	32	14	44%
Edificación pública	Inmuebles Extra MOP (que albergan funciones públicas) intervenidos	nº	57	39	68%
	Inmuebles Extra MOP (que albergan funciones públicas) nuevos	nº	10	8	80%
	Inmuebles MOP intervenidos	nº	11	8	73%
	Inmuebles MOP nuevos	nº	2	4	200%
Promedio del avance de las metas a diciembre del 2021					65%

Dirección de Obras Hidráulicas

Tipología de Obras	Indicador Físico	Unidad de Medida	Meta al 2021	Avance a diciembre 2020	
				Valor Meta	% de la Meta
Defensas y encauzamientos	Tramos protegidos con obras para el manejo de cauces en zonas urbanas y/o rurales	nº	2	2	100%
		m	6.646	168.601	2537%
Embalses y obras de regulación de crecidas	Embalses construidos	nº	3	1	33%
		millones de m3	2,7	2,7	100%
Evacuación y drenaje de aguas lluvias	Colectores intervenidos	nº	3	18	600%
		m	102.200	76.720	75%
	Colectores nuevos	nº	15	4	27%
		m	31.854	8.217	26%
Sistemas de riego	Sistemas de riego mejorados	nº	1	1	100%
		ha	35.000	36.000	103%
	Sistemas de riego nuevos	nº	6	1	17%
		ha	273	3	1%
Promedio del avance de las metas a diciembre del 2021					122%

Dirección de Obras Portuarias

Tipología de Obras	Indicador Físico	Unidad de Medida	Meta al 2021	Avance a diciembre 2020	
				Valor Meta	% de la Meta
Infraestructura de mejoramiento del borde costero	Paseos o bordes costeros nuevos	nº	7	4	57%
		m	1.800	330	18%
Infraestructura de protección de ribera	Protecciones de ribera mejoradas	nº	2	2	100%
		m	1.400	1.100	79%
	Protecciones de ribera nuevas	nº	3	4	133%
		m	2155	3.915	182%
Infraestructura portuaria pesquera artesanal	Caletas pesqueras con obras marítimas construidas	nº	3	3	100%
			6.200	9.400	152%
	Caletas pesqueras con obras terrestres construidas	nº	1	1	100%
		m	1.600	1.893	118%
	Caletas pesqueras existentes mejoradas por el plan regional de infraestructura	nº	4	2	50%
Promedio del avance de las metas a diciembre del 2021					105%

Dirección de Vialidad

Tipología de Obras	Indicador Físico	Unidad de Medida	Meta al 2021	Avance a diciembre 2020	
				Valor	%
Ciclovías	Ciclovías interurbanas construidas	nº	1	1	100%
		km	6	6	100%
Puentes	Puentes interurbanos construidos	nº	1	1	100%
		m	480	480	100%
	Puentes interurbanos repuestos	nº	14	13	93%
		m	955	850	89%
	Puentes urbanos construidos	nº	2	2	100%
		m	1.563	1.563	100%
Red vial	Caminos ampliados	km	15	15	100%
	Caminos pavimentados nuevos o construidos	km	217	217	100%
Vialidad urbana	Obras de VU construidos	nº	1	1	100%
		km	3	3	100%
Promedio del avance de las metas a diciembre del 2021					97%

Dirección General de Agua

Tipología de Obras	Indicador Físico	Unidad de Medida	Meta al 2021	Avance a diciembre 2020	
				Valor	%
red hidrométrica	Estaciones fluviométricas intervenidas	nº	2	10	500%
	Estaciones fluviométricas nuevas	nº	1	10	1000%
	Estaciones nivométricas (rutas de nieve) nuevas	nº	2	2	100%
	Estaciones para nivel de aguas subterráneas nuevas	nº	4	7	175%
Promedio del avance de las metas a diciembre del 2021					322%

Dirección General de Concesiones

Tipología de Obras	Indicador Físico	Unidad de Medida	Meta al 2021	Avance a diciembre 2020	
				Valor	%
infraestructura pública concesionada	hospitales concesionados	nº	1	1	100
		nº de camas	400	400	100
infraestructura vial concesionada	infraestructura vial concesionada	nº	2	2	100
		km	72	72	100
Promedio del avance de las metas a diciembre del 2020					100

ANEXO N°2

Total de iniciativas terminadas por Servicio, UTH, etapa y monto.

SERVICIO	UTH	NOMBRE PROYECTO	ETAPA	MONTO EJECUTADO M\$2022
ADMINISTRACIÓN SISTEMA CONCESIONES	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	HOSPITALES RED SUR (HOSPITALES DE CURICÓ)	EJECUCIÓN	2.618.481
ADMINISTRACIÓN SISTEMA CONCESIONES	REGIÓN	ruta 5, tramo TALCA - CHILLÁN	EJECUCIÓN	22.747.033
ADMINISTRACIÓN SISTEMA CONCESIONES	REGIÓN	ruta 5, tramo SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO	EJECUCIÓN	38.257.841
AGUA POTABLE RURAL	MAULE SUR	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR CORONEL DE MAULE	DISEÑO	19.523
AGUA POTABLE RURAL	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LA PLACETA	PREFACTIBILIDAD	-
AGUA POTABLE RURAL	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LAS GARZAS - LA SUIZA	EJECUCIÓN	1.070.615
AGUA POTABLE RURAL	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LA VALDESINA	EJECUCIÓN	250.573
AGUA POTABLE RURAL	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LA UNIÓN - CALLEJÓN ORTUZAR	EJECUCIÓN	724.753
AGUA POTABLE RURAL	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LA PUNTILLA (ARRIBA)	EJECUCIÓN	587.525
AGUA POTABLE RURAL	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LA ISLA - PICAZO BAJO	EJECUCIÓN	700.116
AGUA POTABLE RURAL	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR HUIMEO - LOS MARCOS	EJECUCIÓN	985.381
AGUA POTABLE RURAL	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR HIGUERILLA - SANATORIO	EJECUCIÓN	942.734
AGUA POTABLE RURAL	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR CUENTAS CLARAS	EJECUCIÓN	523.653
AGUA POTABLE RURAL	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR ACCESO SUR EL MEMBRILLAR	EJECUCIÓN	606.928
AGUA POTABLE RURAL	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	CONSTRUCCIÓN DE SONDAGE SERVICIO APR EL LUCERO	EJECUCIÓN	1.157.380
AGUA POTABLE RURAL	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS	CONSTRUCCIÓN DE SONDAGE SERVICIO APR EL ENCANTO LLANO LAS PIEDRAS	EJECUCIÓN	1.067.694
AGUA POTABLE RURAL	REGIÓN	CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR	EJECUCIÓN	1.369.228
AGUA POTABLE RURAL	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	CONSERVACIÓN SERVICIO APR LOMAS DE PUTAGAN 2	EJECUCIÓN	92.704
AGUA POTABLE RURAL	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR SANTA ROSA-MAITENES EL AROMO	EJECUCIÓN	62.587
AGUA POTABLE RURAL	CUENCA DEL MATAQUITO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA HUERTA-ORILLA DE VALDÉS	EJECUCIÓN	1.027.376
AGUA POTABLE RURAL	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR EL PLUMERO	EJECUCIÓN	1.159.702
AGUA POTABLE RURAL	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR CERRILLOS HACIA RECREO	EJECUCIÓN	813.061

AGUA POTABLE RURAL	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR CALLEJONES HACIA PIRQUE	EJECUCIÓN	630.608
AGUA POTABLE RURAL	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR ABRANQUIL	EJECUCIÓN	776.133
AGUA POTABLE RURAL	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	AMPLIACIÓN SISTEMA APR PUENTE ALTO	EJECUCIÓN	1.048.225
AGUA POTABLE RURAL	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	AMPLIACIÓN SISTEMA APR PALMILLA DE RAUCO	EJECUCIÓN	100.862
AGUA POTABLE RURAL	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS	AMPLIACIÓN SERVICIO APR SAN LUIS SAN RAUL LAS MOTAS	EJECUCIÓN	1.681.466
AGUA POTABLE RURAL	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	AMPLIACIÓN APR SAN VALENTÍN ESTRELLA DE LIRCAY	EJECUCIÓN	233.698
AGUA POTABLE RURAL	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	AMPLIACIÓN APR LOS MONTES HACIA COREL - MACAL - PUENTE ALTO	EJECUCIÓN	1.386.179
AGUA POTABLE RURAL	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN MARCOS - EL CARMEN ORIENTE	EJECUCIÓN	448.823
AGUA POTABLE RURAL	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR REMULCAO	EJECUCIÓN	612.129
AGUA POTABLE RURAL	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CHEQUENLEMU	EJECUCIÓN	-
AGUA POTABLE RURAL	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BAJO ESMERALDA	EJECUCIÓN	903.500
AGUA POTABLE RURAL	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR POTRERO GRANDE	EJECUCIÓN	1.116.519
AGUA POTABLE RURAL	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR LAS HORNILLAS HACIA PORVENIR	EJECUCIÓN	1.325.868
AGUA POTABLE RURAL	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS	AMPLIACIÓN SISTEMA APR EL CARMEN	EJECUCIÓN	80.940
AGUA POTABLE RURAL	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	AMPLIACIÓN SERVICIO APR LOS GUAIÇOS SANTA CATALINA Y OTROS	EJECUCIÓN	2.400.563
AGUA POTABLE RURAL	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR UNIÓN SAN VÍCTOR LAMAS	EJECUCIÓN	1.437.959
AGUA POTABLE RURAL	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR TUTUQUEN	EJECUCIÓN	353.592
AGUA POTABLE RURAL	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR TRICAO	EJECUCIÓN	166.217
AGUA POTABLE RURAL	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SANTA CECILIA - GABRIELA MISTRAL	EJECUCIÓN	610.682
AGUA POTABLE RURAL	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PUENTE PANDO MARIÑICO	EJECUCIÓN	759.235
AGUA POTABLE RURAL	CUENCA DEL MATAQUITO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PERALILLO HACIA PARRONAL	EJECUCIÓN	820.591
AGUA POTABLE RURAL	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS TOSCAS	EJECUCIÓN	1.575.528
AGUA POTABLE RURAL	CUENCA DEL MATAQUITO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA HUERTA HACIA REMOLINO	EJECUCIÓN	-
AGUA POTABLE RURAL	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR SAN FRANCISCO DE RARI	EJECUCIÓN	287.651

AGUA POTABLE RURAL	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR SAN ALEJO	EJECUCIÓN	96.950
AGUA POTABLE RURAL	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR PENCAHUE	EJECUCIÓN	2.045.395
AGUA POTABLE RURAL	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR LA LAGUNA	EJECUCIÓN	1.808.794
AGUA POTABLE RURAL	MAULE SUR	MEJORAMIENTO SERVICIO APR POCILLAS	EJECUCIÓN	54.554
AGUA POTABLE RURAL	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LANCH DE QUERI - MAULE SUR (QUEMAUS)	EJECUCIÓN	882.997
AGUA POTABLE RURAL	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LA POSADA	EJECUCIÓN	11.204
AGUA POTABLE RURAL	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	CONSTRUCCIÓN SERVICIO ORILLA DE PURAPEL	EJECUCIÓN	712.921
AGUA POTABLE RURAL	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR. EL ESTERO	EJECUCIÓN	618.182
AGUA POTABLE RURAL	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR VEGA DE SALAS	EJECUCIÓN	42.914
AGUA POTABLE RURAL	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR TRINIDAD - COLIN - LOS AMIGOS	EJECUCIÓN	458.385
AGUA POTABLE RURAL	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR SANTA ROSA DE LAVADERO	EJECUCIÓN	791.774
AGUA POTABLE RURAL	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR ROBLERÍA CHUPALLAR	EJECUCIÓN	984.707
AGUA POTABLE RURAL	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR SN LUIS MOTAS	EJECUCIÓN	-
AGUA POTABLE RURAL	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR RENAICO MONTEFLOR	EJECUCIÓN	681.885
AGUA POTABLE RURAL	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR PALO BLANCO	EJECUCIÓN	423.675
AGUA POTABLE RURAL	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR MAITENES	EJECUCIÓN	670.474
AGUA POTABLE RURAL	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LOS COPIHUES - LOS HUALONCO	EJECUCIÓN	832.309
AGUA POTABLE RURAL	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN ANTONIO ENCINA, LINARES	EJECUCIÓN	1.002.066
AGUA POTABLE RURAL	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RABONES HACIA LOS AVELLANOS, COLBUN	EJECUCIÓN	696.809
AGUA POTABLE RURAL	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR BATUCO HACIA VILLA BATUCO, PENCAHUE	EJECUCIÓN	1.013.454
AGUA POTABLE RURAL	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR POTRERO GRANDE, CURICÓ	EJECUCIÓN	161.895
AGUA POTABLE RURAL	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	MEJORAMIENTO SISTEMA APR CALIBORO, SAN JAVIER	EJECUCIÓN	832.543
AGUA POTABLE RURAL	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR VARA GRUESA	EJECUCIÓN	-
AGUA POTABLE RURAL	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR PEÑUELAS	EJECUCIÓN	-
AGUA POTABLE RURAL	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA CHIRIPA	EJECUCIÓN	275.903

AGUA POTABLE RURAL	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR EL TRIUNFO - SANTA CECILIA - SAN JORGE	EJECUCIÓN	615.707
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	NORMALIZACIÓN AERÓDROMO GENERAL FREIRE DE CURICÓ	EJECUCIÓN	535.881
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS	MAULE SUR	NORMALIZACIÓN AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES	EJECUCIÓN	45.718
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	MAULE SUR	REPOSICION ESCUELA CURANIPE, PELLUHUE.	EJECUCIÓN	-
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	NORMALIZACION HOSPITAL PROVINCIAL DE CURICÓ	EJECUCIÓN	243.069.749
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	REPOSICIÓN Y REUBICACIÓN OFICINAS Y TALLERES DIRECCIÓN VIALIDAD LINARES	EJECUCIÓN	1.674.465
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	MAULE SUR	REPOSICIÓN OFICINAS Y TALLERES DIRECCIÓN PROV. VIALIDAD CAUQUENES	EJECUCIÓN	514.246
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	REPOSICIÓN OFICINA PROVINCIAL VIALIDAD DE TALCA (CRUCE VAROLI S/Nº)	EJECUCIÓN	431.891
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	REPOSICIÓN EDIFICIO OFICINAS DIRECCIÓN PROVINCIAL VIALIDAD CURICÓ	EJECUCIÓN	265.270
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	REPOSICIÓN DIRECCIÓN GRAL. DE AGUAS MOP REGIÓN DEL MAULE	EJECUCIÓN	255.823
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	ÁREA PONIENTE DE LA PROVINCIA DE TALCA	RECONSTRUCCIÓN INSPECTORIA VIALIDAD DE CUREPTO	EJECUCIÓN	-
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	HABILITACIÓN EDIFICIO MOP - REGIÓN DEL MAULE	EJECUCIÓN	4.298.987
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	REGIÓN	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL	EJECUCIÓN	94.753
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR ESCUELA PRESIDENTE JOSÉ BALMACEDA, CURICÓ.	EJECUCIÓN	150.480
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR EDIFICIO SERVICIOS PÚBLICOS DE TALCA	EJECUCIÓN	29.105
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL LICEO VIEJO DE TENO	EJECUCIÓN	156.680
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	RESTAURACIÓN TEMPLO PARROQUIAL NIÑO JESÚS DE VILLA ALEGRE	EJECUCIÓN	1.758.815
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	MAULE SUR	RESTAURACIÓN PARROQUIA SAN AMBROSIO DE CHANCO	EJECUCIÓN	3.209.041
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	ÁREA PONIENTE DE LA PROVINCIA DE TALCA	RESTAURACIÓN PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE GUALLECO	EJECUCIÓN	2.098.218
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	RESTAURACIÓN IGLESIA DE NIRIVILO	EJECUCIÓN	-
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR VILLA CULTURAL HUILQUILEMU	EJECUCIÓN	199.274
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR PARROQUIA SAN JOSÉ DE PELARCO	EJECUCIÓN	143.152
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR MUSEO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DE VILLA ALEGRE	EJECUCIÓN	163.948
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR INTENDENCIA REGIONAL DEL MAULE-TALCA	EJECUCIÓN	737.191

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR IGLESIA SAN FRANCISCO DE CURICÓ	EJECUCIÓN	81.175
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	RESTAURACIÓN CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE BATUCO	EJECUCIÓN	1.565.882
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	REPOSICIÓN Y EQUIPAMIENTO CUARTEL PDI LINARES	EJECUCIÓN	6.071.720
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	REPOSICIÓN OFICINA LINARES DEL SRCEI	EJECUCIÓN	-
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	CUENCA DEL MATAQUITO	REPOSICIÓN OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE VICHUQUÉN	EJECUCIÓN	-
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	REPOSICIÓN OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE TALCA Y DIRECCIÓN REGIONAL DEL MAULE	EJECUCIÓN	3.851.128
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	REPOSICIÓN HANGAR AEROPOLICIAL TALCA (UNIDAD ESPECIAL)	EJECUCIÓN	812.789
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	REPOSICIÓN DE LA HABITABILIDAD 3ª COMISARÍA DE CARABINEROS DE TALCA.	EJECUCIÓN	1.920.439
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN CUARTEL PDI SAN JAVIER.	EJECUCIÓN	1.762.694
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	ÁREA PONIENTE DE LA PROVINCIA DE TALCA	REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN CUARTEL PDI CONSTITUCIÓN	EJECUCIÓN	1.640.626
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	REPOSICIÓN 4ª COMISARÍA DE CARABINEROS DE MOLINA.	EJECUCIÓN	2.164.347
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS	REPOSICION Y NORMALIZACION ESC. AMBROSIA TAPIA, G-475, PASO CUÑAO.	EJECUCIÓN	770.467
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	REPOSICION PARCIAL CON EQUIPAMIENTO ESCUELA EDUARDO FREI DE MOLINA	EJECUCIÓN	3.547.252
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	REPOSICIÓN DEPARTAMENTO DE SALUD DE LINARES	EJECUCIÓN	898.747
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	ÁREA PONIENTE DE LA PROVINCIA DE TALCA	REPOS. NORM. Y REPAR LICEO CONSTITUCION	EJECUCIÓN	4.004.286
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	MAULE SUR	REP. ESTADIO MUNICIPAL DE PELLUHUE	EJECUCIÓN	2.395.722
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	NORMALIZACION ESCUELA PANGUE ARRIBA	EJECUCIÓN	838.319
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO SAN CLEMENTE	EJECUCIÓN	1.456.057
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO PARA LA COMUNA DE TENO	EJECUCIÓN	1.924.731
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	CONSTRUCCIÓN CAMPUS UNIVERSITARIO UNIVERSIDAD DE TALCA EN LA CIUDAD DE LINARES	EJECUCIÓN	8.778.652
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS	REPOSICIÓN 3ª COMISARÍA DE CARABINEROS DE PARRAL.	EJECUCIÓN	2.574.170
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	REPOSICIÓN 3ª COMISARÍA DE CARABINEROS DE TENO.	EJECUCIÓN	1.801.413
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	REPOSICIÓN 1ª COMISARÍA DE CARABINEROS DE SAN CLEMENTE.	EJECUCIÓN	2.056.168
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	RECONSTRUCCIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL Y MUNICIPALIDAD DE RAUCO	EJECUCIÓN	1.498.902

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	RECONSTRUCCIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL Y MUNICIPALIDAD DE LINARES	EJECUCIÓN	43.340
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	RECONSTRUCCIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL Y MUNICIPALIDAD DE HUALAÑÉ	EJECUCIÓN	123.682
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	RECONSTRUCCIÓN SEGUNDA CÍA. DE BOMBEROS DE TALCA.	EJECUCIÓN	745.667
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	RECONSTRUCCIÓN LICEO MARTA DONOSO ESPEJO (TALCA)	EJECUCIÓN	8.127.636
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS	RECONSTRUCCIÓN LICEO GUILLERMO MARÍN, RETIRO.	EJECUCIÓN	5.317.698
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	RECONSTRUCCIÓN LICEO ABATE MOLINA (TALCA)	EJECUCIÓN	5.477.850
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	RECONSTRUCCIÓN INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO ENRIQUE MALDONADO (INSUCO) - TALCA.	EJECUCIÓN	7.963.589
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	RECONSTRUCCIÓN ESCUELA ISABEL RIQUELME (LINARES)	EJECUCIÓN	2.793.074
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	ÁREA PONIENTE DE LA PROVINCIA DE TALCA	RECONSTRUCCIÓN ESC. ENRIQUE DONN MÜLLER DE CONSTITUCIÓN.	EJECUCIÓN	2.146.820
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	RECONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CURICÓ	EJECUCIÓN	9.354.384
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS	RECONSTRUCCIÓN CUARTEL GENERAL Y PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA CÍA. DE BOMBEROS DE PARRAL.	EJECUCIÓN	627.774
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	RECONSTRUCCIÓN CUARTEL GENERAL Y PRIMERA CÍA. DE BOMBEROS SAGRADA FAMILIA.	EJECUCIÓN	467.601
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	RECONSTRUCCIÓN CUARTA CÍA. DE BOMBEROS DE TALCA.	EJECUCIÓN	578.986
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA ESTADIO LA GRANJA	EJECUCIÓN	4.123.090
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE CASA 2 VARONES Y CONSERVACIÓN DE PINTURA CTD ENTRE SILOS	EJECUCIÓN	149.403
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	AMPLIACIÓN 5ª COMISARÍA DE CARABINEROS DE SAN JAVIER.	EJECUCIÓN	644.193
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO FISCALÍA LOCAL DE TALCA	EJECUCIÓN	5.278.834
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	CONSTRUCCIÓN RECINTO MODELO DE EDUCACIÓN Y TRABAJO LA LAGUNA	EJECUCIÓN	105.765.688
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	CONSTRUCCIÓN FISCALÍA LOCAL DE LINARES	EJECUCIÓN	1.600.240
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	CONSTRUCCIÓN CENTRO CERRADO VII REGION	EJECUCIÓN	252.379
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	REPARACIÓN Y NORMALIZACIÓN EDIFICIO SECREDEC REGIÓN DEL MAULE	EJECUCIÓN	1.371.743
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	CONSTRUCCIÓN CAMPAMENTOS INVERNALES DE VIALIDAD PASO PEHUENCHE (CAMPAMENTO 2 Y 3)	EJECUCIÓN	-

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	CONSTRUCCIÓN CAMPAMENTOS INVERNALES DE VIALIDAD PASO PEHUENCHE (CAMPAMENTO 1)	EJECUCIÓN	-
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	CONSTRUCCIÓN OBRAS SISTEMA DE RIEGO UNIFICADO EMBALSE ANCOA	EJECUCIÓN	3.147.560
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS	REGIÓN	CONSERVACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS VII REGIÓN	EJECUCIÓN	4.590.404
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS	REGIÓN	CONSERVACIÓN DE RIBERAS EN CAUCES NATURALES VII REGIÓN REGIÓN DEL MAULE	EJECUCIÓN	9.949.215
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS FREIRE	EJECUCIÓN	1.810.809
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	REVESTIMIENTO DE RIBERA SECTOR HUAPI ETAPA 3	EJECUCIÓN	-
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES	EJECUCIÓN	31.298.480
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS	MAULE SUR	CONSTRUCCIÓN ENCAUZAMIENTO ESTERO LOS PUERCOS Y TAPIHUE	EJECUCIÓN	-
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS	ÁREA PONIENTE DE LA PROVINCIA DE TALCA	CONSTRUCCIÓN EMBALSE EMPEDRADO	EJECUCIÓN	22.439.913
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	CONSTRUCCIÓN COLECTORES SISTEMA CUELLAR URBANIZADO	EJECUCIÓN	20.249.899
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS	REGIÓN	CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCALES EN LA REGIÓN DEL MAULE	EJECUCIÓN	1.531.988
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS	ÁREA PONIENTE DE LA PROVINCIA DE TALCA	MEJORAMIENTO BORDE COSTERO FLUVIAL CONSTITUCIÓN	EJECUCIÓN	11.460.300
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS	MAULE SUR	AMPLIACIÓN CALETA PESQUERA ARTESANAL PELLUHUE	EJECUCIÓN	2.645.939
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS	ÁREA PONIENTE DE LA PROVINCIA DE TALCA	MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LOANCO	EJECUCIÓN	1.025.530
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS	CUENCA DEL MATAQUITO	MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DUAO - ILOCA. COMUNA LICANTÉN	EJECUCIÓN	2.281.365
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS	ÁREA PONIENTE DE LA PROVINCIA DE TALCA	CONSTRUCCIÓN MUELLE PESQUERO ARTESANAL, CALETA MAGUELLINES (OBRAS TERRESTRES COMPLEMENTARIAS)	EJECUCIÓN	1.435.240
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS	ÁREA PONIENTE DE LA PROVINCIA DE TALCA	CONSTRUCCIÓN MUELLE PESQUERO ARTESANAL, CALETA MAGUELLINES	EJECUCIÓN	14.082.598
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS	REGIÓN	CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE	EJECUCIÓN	6.195.552
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS	REGIÓN	CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS	EJECUCIÓN	352.174
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS	ÁREA PONIENTE DE LA PROVINCIA DE TALCA	CONSERVACION ESPIGON ORREGO CONSTITUCION	EJECUCIÓN	266.098
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS	ÁREA PONIENTE DE LA PROVINCIA DE TALCA	CONSERVACION ESPIGON QUIVOLGO	EJECUCIÓN	27.565
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS	MAULE SUR	CONSERVACIÓN LUMINARIAS CALETAS LLICO, DUAO Y PELLUHUE	EJECUCIÓN	68.821
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS	MAULE SUR	CONSERVACIÓN MURO EXPLANADA E INFRAESTRUCTURA CALETA PELLUHUE	EJECUCIÓN	308.460
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS	CUENCA DEL MATAQUITO	AMPLIACIÓN CALETA PESQUERA ARTESANAL DUAO	EJECUCIÓN	2.586.493
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS	ÁREA PONIENTE DE LA PROVINCIA DE TALCA	MEJORAMIENTO BORDE COSTERO CONSTITUCIÓN	EJECUCIÓN	130.681

DIRECCIÓN DE VIALIDAD	MAULE SUR	REPOSICIÓN PUENTE DOÑA TORIBIA, EN RUTA M-500	EJECUCIÓN	-
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	CUENCA DEL MATAQUITO	REPOSICION PUENTE LOS PUERCO EN RUTA K-60	EJECUCIÓN	2.969.674
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO PUENTE AGUA BUENA EN RUTA L-30-M	EJECUCIÓN	160.100
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	MAULE SUR	MEJORAMIENTO RUTA M-500, CAUQUENES - CHANCO POR MOLCO (SOLUCIÓN BÁSICA - FNDR 2011).	EJECUCIÓN	1.253.975
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	MAULE SUR	MEJORAMIENTO LA VIRGEN - LA MANGA - TEQUERAL - POBLACIÓN LOYOLA (SOLUCIÓN BÁSICA - FNDR 2011).	EJECUCIÓN	1.488.046
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	CONSTRUCCION CIRCUNVALACION NORTE DE CURICO	PREFACTIBILIDAD	248.304
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	MAULE SUR	MEJORAMIENTO RUTA M-450, SECTOR CHANCO-EMPEDRADO	DISEÑO	546.117
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	ÁREA PONIENTE DE LA PROVINCIA DE TALCA	MEJORAMIENTO ACCESO SUR PUENTE RAUL SILVA HENRIQUEZ EN CONSTITUCION	EJECUCIÓN	4.404.059
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	REGIÓN	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2015 -	EJECUCIÓN	4.951.361
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	REGIÓN	CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018	EJECUCIÓN	221
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS	MEJORAMIENTO RUTA L-665, AJIAL - SANTA DELFINA (SOLUCIÓN BÁSICA - FNDR 2011).	EJECUCIÓN	1.375.426
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	MEJORAMIENTO RUTA 115-CH S: QUEBRADA LOS TOROS-LÍMITE PASO PEHUENCHE	EJECUCIÓN	-
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	MEJORAMIENTO CUMPEO - CASAS VIEJAS - SAN GERARDO - LOS MAITENES (SOLUCIÓN BÁSICA - FNDR 2011).	EJECUCIÓN	1.309.839
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	AMPLIACIÓN INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA	EJECUCIÓN	7.195.140
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO	EJECUCIÓN	12.046.872
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	CUENCA DEL MATAQUITO	MEJORAMIENTO RUTA J-70-I, S. CRUCE RUTA J-60 (PARRONAL)-LIM. REG. -	EJECUCIÓN	15.858.718
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	HABILITACIÓN CIRCUNVALACIÓN SUR DE TALCA	EJECUCIÓN	18.265.535
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN NORTE A LINARES	EJECUCIÓN	14.580.094
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	REPOSICIÓN Y REUBICACIÓN PUENTE BOCATOMA EN RUTA K-589	EJECUCIÓN	610.410
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	REPOSICIÓN PUENTE SAN CAMILO Y ACCESOS SOBRE EL RIO CLARO S:ITAHUE	EJECUCIÓN	1.637.491
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	ÁREA PONIENTE DE LA PROVINCIA DE TALCA	REPOSICIÓN PUENTE PELLINES Y ACCESOS, RTA.M-50 CHANCO-CONSTITUCIÓN	EJECUCIÓN	647.934
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	REPOSICIÓN PUENTE EL COLORADO EN RUTA J-615	EJECUCIÓN	3.231.805
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	MAULE SUR	REPOSICIÓN PAV. RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO	EJECUCIÓN	25.126.340

DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	REPOSICIÓN PAV. RUTA K-25 SECTOR: MOLINA- LOS ROBLES.	EJECUCIÓN	12.800.524
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	MEJORAMIENTO RUTAS J-310-120 S: CR. LONGITUDINAL - LA AURORA - TENO	EJECUCIÓN	8.385.539
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	MAULE SUR	MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LIMITE REGIONAL	EJECUCIÓN	18.528.973
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO	EJECUCIÓN	6.250.186
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	MEJORAMIENTO RUTA L-45 S: EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES	EJECUCIÓN	1.946.814
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI	EJECUCIÓN	9.669.299
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCERUTA 115-CH	EJECUCIÓN	7.119.638
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	MEJORAMIENTO RUTA 115 CH, S: PUENTE LO AGUIRRE-LIMITE PASO PEHUENCHE	EJECUCIÓN	20.178.232
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	MEJORAMIENTO RUTA 115 CH, S: ACC. CENTRAL CIPRESES-QBRADA LOS TOROS	EJECUCIÓN	2.288.876
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	REGIÓN	CONTRATOS GLOBALES	EJECUCIÓN	4.806.251
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	CONSTRUCCIÓN VARIANTE SAN CLEMENTE EN RUTA 115 CH, COM. SN CLEMENTE	EJECUCIÓN	13.101.711
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RIO MAULE (COLBUN) Y ACCESOS	EJECUCIÓN	24.825.116
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	CUENCA DEL MATAQUITO	CONSTRUCCIÓN ACCESO SUR PUENTE LLICO (CAMINO REAL)	EJECUCIÓN	5.044.896
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	REGIÓN	CONSERVACION RED VIAL	EJECUCIÓN	318.852.558
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE	EJECUCIÓN	48.138.257
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	REGIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	EJECUCIÓN	22.110.459
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	CONSTRUCCION PUENTE SIFON Y ACCESO EN RUTA L-32 VII REGION	EJECUCIÓN	-
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	MAULE SUR	REPOSICIÓN RUTA 126 RUTA LOS CONQUISTADORES, COMUNA CAUQUENES	EJECUCIÓN	15.019.589
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	REGIÓN	REPOSICIÓN DE 12 PUENTES DE LA REGIÓN DEL MAULE	EJECUCIÓN	569.215
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	MEJORAMIENTO RUTA L-413, SAN ANTONIO -ENCINAS (SOLUCIÓN BÁSICA- FNDR 2011).	EJECUCIÓN	1.139.772
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	MEJORAMIENTO RUTA L-39, LA UNIÓN - EL MELADO (SOLUCIÓN BÁSICA - FNDR 2011).	EJECUCIÓN	1.099.033
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	MEJORAMIENTO RUTA L-15, PANGAL - PEÑUELAS (SOLUCIÓN BÁSICA- FNDR 2011)	EJECUCIÓN	1.814.693
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	MEJORAMIENTO MOLINA - ITAHUE - ZAPALLAR - LA FLORIDA - EL BOLDAL (SOLUCIÓN BÁSICA - FNDR 2011).	EJECUCIÓN	1.899.140
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	MEJORAMIENTO HACIENDA DE MAULE - QUIÑIPEUMO - LOS GANADEROS (SOLUCIÓN BÁSICA - FNDR 2011).	EJECUCIÓN	1.011.705

DIRECCIÓN DE VIALIDAD	ÁREA PONIENTE DE LA PROVINCIA DE TALCA	REPOSICIÓN PUENTE LA ORILLA EN RUTA M-24-K, KM. 1.13	EJECUCIÓN	1.588.296
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	REGIÓN	CONTRATOS GLOBALES MIXTAS	EJECUCIÓN	68.101.372
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	CONSTRUCCIÓN INSPECTORIA VIALIDAD, PASO PEHUENCHE	EJECUCIÓN	6.952.375
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	CICLOVIAS EN PROYECTOS URBANOS E INTERURBANIS (INTERCONEXION NORTE SUR DE TALCA, CIRCUNVALACION SUR DE TALCA)	EJECUCIÓN	-
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS	REGIÓN	PLAN HÍDRICO REGIONAL	EJECUCIÓN	271.520
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS	REGIÓN	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRANEOS ZONA CENTRO SUR	EJECUCIÓN	-
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS	REGIÓN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN RED DE MEDICIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS	EJECUCIÓN	122.028
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS	REGIÓN	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA NACIONAL	EJECUCIÓN	-
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS	REGIÓN	CONSERVACIÓN DE LA RED DE CALIDAD DE AGUAS SUBTERRÁNEAS	EJECUCIÓN	-
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS	REGIÓN	CONSERVACIÓN DE LA RED DE CALIDAD DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA NACIONAL	EJECUCIÓN	6.115
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS	REGIÓN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN RED FLUVIOMÉTRICA	EJECUCIÓN	-
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	AMPLIACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICAS	EJECUCIÓN	-
TOTAL				1.465.894.120

ANEXO N°3

Total de iniciativas en ejecución por Servicio, UTH, etapa y monto.

SERVICIO	UTH	NOMBRE PROYECTO	ETAPA	MONTO EJECUTADO M\$2022
AGUA POTABLE RURAL	MAULE SUR	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR NAME SUR	PREFACTIBILIDAD	13.671
AGUA POTABLE RURAL	CUENCA DEL MATAQUITO	MEJORAMIENTO SERVICIO APR LORA	EJECUCIÓN	66.242
AGUA POTABLE RURAL	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA SEXTA SAN JOSE	DISEÑO	27.855
AGUA POTABLE RURAL	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR CAMARICO	EJECUCIÓN	80.671
AGUA POTABLE RURAL	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	AMPLIACIÓN SISTEMA APR EL MOLINO VENTANA DEL ALTO A SANTA LAURA	EJECUCIÓN	66.114
AGUA POTABLE RURAL	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR PEÑASCO LLEPO	EJECUCIÓN	-
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	RESTAURACIÓN SANTUARIO INMACULADA CONCEPCIÓN DE CORINTO	DISEÑO	128.251
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	MAULE SUR	RESTAURACIÓN PARROQUIA SAN LUIS DE GONZAGA DE SAUZAL	EJECUCIÓN	66.813
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	ÁREA PONIENTE DE LA PROVINCIA DE TALCA	RESTAURACIÓN PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CUREPTO	DISEÑO	180.566
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	RESTAURACIÓN PARROQUIA CORAZÓN DE MARÍA DE LINARES	DISEÑO	15.856
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	RESTAURACIÓN IGLESIA DEL APÓSTOL PEDRO DE TALCA	DISEÑO	201.069
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	ÁREA PONIENTE DE LA PROVINCIA DE TALCA	RESTAURACIÓN IGLESIA DE HUENCHULLAMÍ	DISEÑO	188.101
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	RESTAURACIÓN MERCADO CENTRAL DE TALCA	DISEÑO	416.792
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	REPOSICION Y EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO LEGAL, TALCA	EJECUCIÓN	3.352.362
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	ÁREA PONIENTE DE LA PROVINCIA DE TALCA	REPOSICION TEATRO MUNICIPAL CONSTITUCIÓN - REPOSICION CENTRO CIVICO DE CONSTITUCION	EJECUCIÓN	2.002.437
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	CUENCA DEL MATAQUITO	REPOSICION CON EQUIPAMIENTO ESCUELA LA HUERTA DE HUALAÑE	EJECUCIÓN	150.114
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, SAN JAVIER	DISEÑO	188.092
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	NORMALIZACION LICEO MANUEL MONTT, SAN JAVIER	DISEÑO	362.095
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	NORMALIZACIÓN CON EQUIPAMIENTO ESCUELA CARLOS SALINAS LAGOS	DISEÑO	218.645
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	MAULE SUR	HABILITACION TEATRO MUNICIPAL CAUQUENES	EJECUCIÓN	164.484
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	CONSTRUCCIÓN PISCINA TEMPERADA SEMIOLIMPICA EN SAN JAVIER	DISEÑO	120.292
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	ÁREA PONIENTE DE LA PROVINCIA DE TALCA	RECONSTRUCCIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL Y MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCIÓN	EJECUCIÓN	43.362

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	REPOSICIÓN OFICINA CURICÓ DEL SRCEI	EJECUCIÓN	1.198.499
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS	ÁREA PONIENTE DE LA PROVINCIA DE TALCA	CONSTRUCCIÓN EVACUADORES AGUAS LLUVIAS SISTEMAS ESTERO MAPOCHITO, ESTERO LAS ÁNIMAS Y OTRO SISTEMAS MENORES.	DISEÑO	175.760
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	CONSTRUCCIÓN ELEVACIÓN MECÁNICA DEL SISTEMA LONCOMILLA	DISEÑO	482.942
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS	CUENCA DEL MATAQUITO	ANÁLISIS DESEMBOCADURA ESTERO LLICO	EJECUCIÓN	114.390
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS	MAULE SUR	MEJORAMIENTO BORDE COSTERO CURANIPE Y PELLUHUE	DISEÑO	236.466
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS	CUENCA DEL MATAQUITO	MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LLICO, BOYERUCA LAGO VICHUQUÉN	EJECUCIÓN	137.075
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	DIAGNOSTICO ESTABILIZACION DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LOS MONJES BLANCOS	EJECUCIÓN	1.318.969
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	MEJORAMIENTO RUTA L-11, SECTOR CRUCE RUTA 5-COMPUERTAS MAULE SUR	DISEÑO	594.939
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	MEJORAMIENTO RUTA K-20 SECTOR: CRUCE RUTA K-60 (GUALLECO)- CRUCE J-52-K(CARRIZAL)	DISEÑO	282.860
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	MEJORAMIENTO RUTA K-15 SECTOR : RUTA 5(LONTUE) - MOLINA	DISEÑO	308.431
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K 610 CON RUTA 120	DISEÑO	963.018
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	MEJORAMIENTO RUTA K-16, SECTOR LONTUE - SAGRADA FAMILIA	DISEÑO	351.104
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	MEJORAMIENTO RUTA J-40 SECTOR: RAUCO - TENO	DISEÑO	609.137
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	REGIÓN	PROGRAMA DE CAMINOS BASICOS	EJECUCIÓN	59.026.508
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS	REPOSICIÓN PUENTE LAS JUNTAS EN RUTA L-831	EJECUCIÓN	1.401.131
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	MAULE SUR	REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN	EJECUCIÓN	43.114.032
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS-PARQUE INGLES	EJECUCIÓN	16.089.563
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	CUENCA DEL MATAQUITO	MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, S: BOYERUCA-CR. RUTA J-60	EJECUCIÓN	4.331.120
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	MAULE SUR	CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 128 Y RUTA 126, SECTOR CAUQUENES	DISEÑO	266.363
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	REPOSICIÓN PAV. RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCES RUTA COSTERA	EJECUCIÓN	745.480
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	MEJORAMIENTO RUTA L-32/370/374, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCES RUTA 126	EJECUCIÓN	871.924
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	CUENCA DEL MATAQUITO	MEJORAMIENTO RUTA J-80, S: CR. J-60(HUALAÑE)-CR. RUTA COSTERA	EJECUCIÓN	675.545
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNIÓN - LOS QUEÑES	EJECUCIÓN	8.629.772

DIRECCIÓN DE VIALIDAD	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS	CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERAN S: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES	EJECUCIÓN	1.448.898
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	REGIÓN	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017-2021	EJECUCIÓN	11.313.959
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	MAULE SUR	CONSTRUCCIÓN CAMINO COSTERO SECTOR: PUEBLO HUNDIDO-BIF. CHOVELLEN -	DISEÑO	1.254.922
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	ÁREA PONIENTE DE LA PROVINCIA DE TALCA	REPOSICIÓN RUTA L-30-M, SECTOR PUENTE PURAPEL-CONSTITUCION	DISEÑO	438.239
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 115 CH - RUTA 5 EN TALCA	DISEÑO	1.327.475
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA L-11 Y RUTA L-535, INCL PTE ACHIBUENO	EJECUCIÓN	1.979.287
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	REGIÓN	CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA VII REG DEL MAULE	EJECUCIÓN	2.329.264
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	REPOSICIÓN PAV. RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN-PANIMÁVIDA-LINARES	EJECUCIÓN	1.498.826
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR: RUTA K-120 - ACCESO SUR A CURICO	EJECUCIÓN	1.474.875
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS	REGIÓN	AMPLIACIÓN DE RED DE PIEZÓMETROS REGIONAL	EJECUCIÓN	97.916
-				173.142.573

ANEXO N°4

Total de iniciativas sin ejecución por Servicio, UTH, etapa y monto.

SERVICIO	UTH	NOMBRE PROYECTO	ETAPA	MONTO EJECUTADO M\$2022
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	CONSTRUCCION DE COBERTIZOS RUTA 115-CH SECTOR : CUESTA LA ZORRA	DISEÑO	-
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	CONSTRUCCION PUENTE CALIBORO, EN RUTAS L-600 Y L-372	EJECUCIÓN	-
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	MAULE SUR	REPOSICION RUTA M-36-L SECTOR: SEPULTURA-SAUZAL -	EJECUCIÓN	-
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA K-45 CON RUTA K-55; SECTOR LAGUNILLA	EJECUCIÓN	-
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	REPOSICIÓN PUENTE LAS ARBOLEDAS, EN RUTA L-355	DISEÑO	-
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	REPOSICIÓN PUENTE LA PALMILLA, EN RUTA J-470	DISEÑO	-
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	MAULE SUR	REPOSICIÓN PUENTE EL MAITÉN, EN RUTA M-850	DISEÑO	-
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	REPOSICIÓN PUENTE EL BELLOTO, EN RUTA K-16	DISEÑO	-
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	REPOSICIÓN PUENTE CACHAPIVIL, EN RUTA L-320	EJECUCIÓN	-
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	MEJORAMIENTO RUTAS K-55 SECTOR: PUNTA DIAMANTE-BIFURCACIÓN AURORA	EJECUCIÓN	-
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	CUENCA DEL MATAQUITO	REPOSICIÓN PAV. RUTA J-60, SECTOR LICANTEN-CRUCO RUTA COSTERA	EJECUCIÓN	-
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	ÁREA PONIENTE DE LA PROVINCIA DE TALCA	REPOSICIÓN RIPIO R. K-690,M-20-K S:CR. R. K-60 (GUALLECO)-CARRIZAL	DISEÑO	-
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO EMBALSE ANCOA.	HABILITACION AVENIDA ENLACE RUTA 125(AV. LEON BUSTOS)-CIRCUNVALACION NORTE DE LINARES	DISEÑO	-
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	CUENCA DEL MATAQUITO	MEJORAMIENTO RUTA J-60 PASADA POR HUALAÑE	DISEÑO	-
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	REPOSICIÓN RUTA J-60. SECTOR: LA HIGUERA-LICANTEN -	EJECUCIÓN	-
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	REPOSICIÓN RUTA J-60 RAUCO-PALQUIBUDI -	EJECUCIÓN	-
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	CONSTRUCCION PUENTE MAICA, EN RUTAS L-212 Y L 214	EJECUCIÓN	-
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	REGIÓN	ADQUISICION MAQUINARIA PARA EJECUCIÓN DE SELLOS ASFALTICOS POR ADMINISTRACION DIRECTA	EJECUCIÓN	-
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	ÁREA PONIENTE DE LA PROVINCIA DE TALCA	CONSTRUCCION DOBLE VIA A CONSTITUCION	EJECUCIÓN	-
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	REGIÓN	PROGRAMA DE CAMINOS BASICOS (CONVENIO DE PROGRAMACION PARTE III, 2014-2019, VIGENTE)	EJECUCIÓN	-

DIRECCIÓN DE VIALIDAD	REGIÓN	CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA VII REGION	EJECUCIÓN	-
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	REPOSICIÓN RUTA J-60. SECTOR: PARRONAL-LA HIGUERA	EJECUCIÓN	-
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE CURICÓ	REPOSICIÓN RUTA J-60. SECTOR: PALQUIBUDI-PARRONAL	EJECUCIÓN	-
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	VALLE CENTRAL Y PRECORDILLERA DE TALCA	PUENTE PIDUCO	EJECUCIÓN	-
